



Sanierung des Weser-Lutter Kanals 1. Bauabschnitt Teutoburger Str. – Siekerwall

Sitzung der Bezirksvertretung Mitte am 06.03.2014

Erfolgte Baumaßnahmen

1. Bauphase: Sohlsanierung


Ziel: Stabilisierung der Sohle



Stand der Planung und Vorbereitung – Erfolgte Baumaßnahmen

1. Bauphase: Sohlsanierung


Ziel: Stabilisierung der Sohle

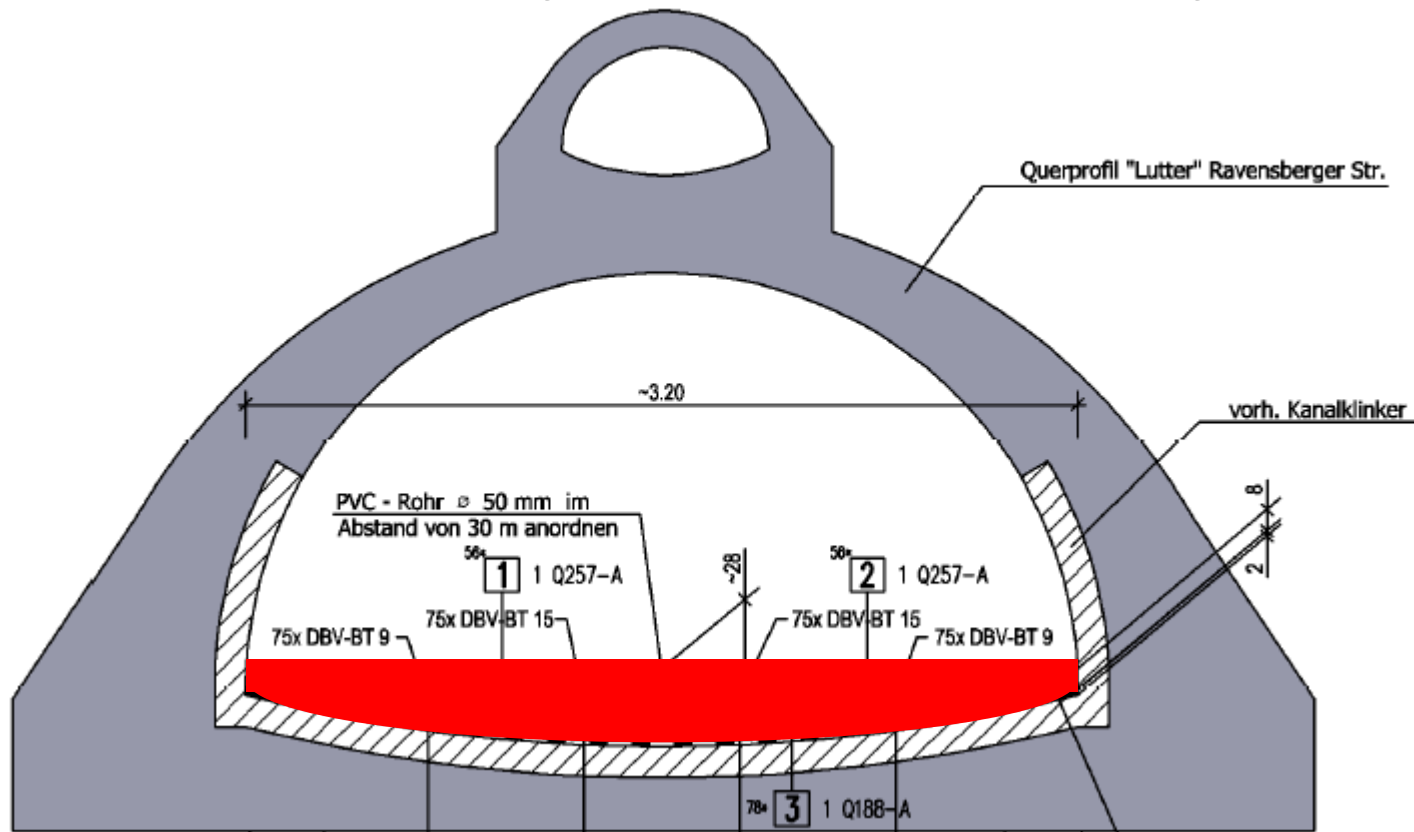




Stand der Planung und Vorbereitung – Aktuelle Bearbeitung

2. Bauphase: Offene Sanierung Ziel: Endgültige Ertüchtigung des Kanals

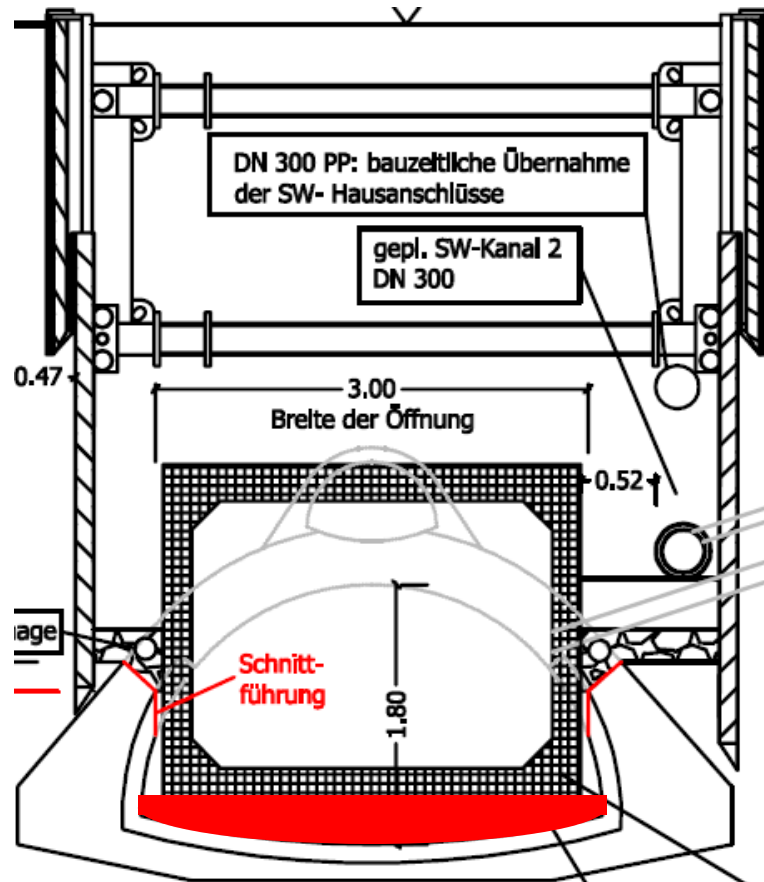

Geplante Baumaßnahmen

**Bypass und Schachtbauwerke
Grünfläche
Siekerwall - Niederwall**

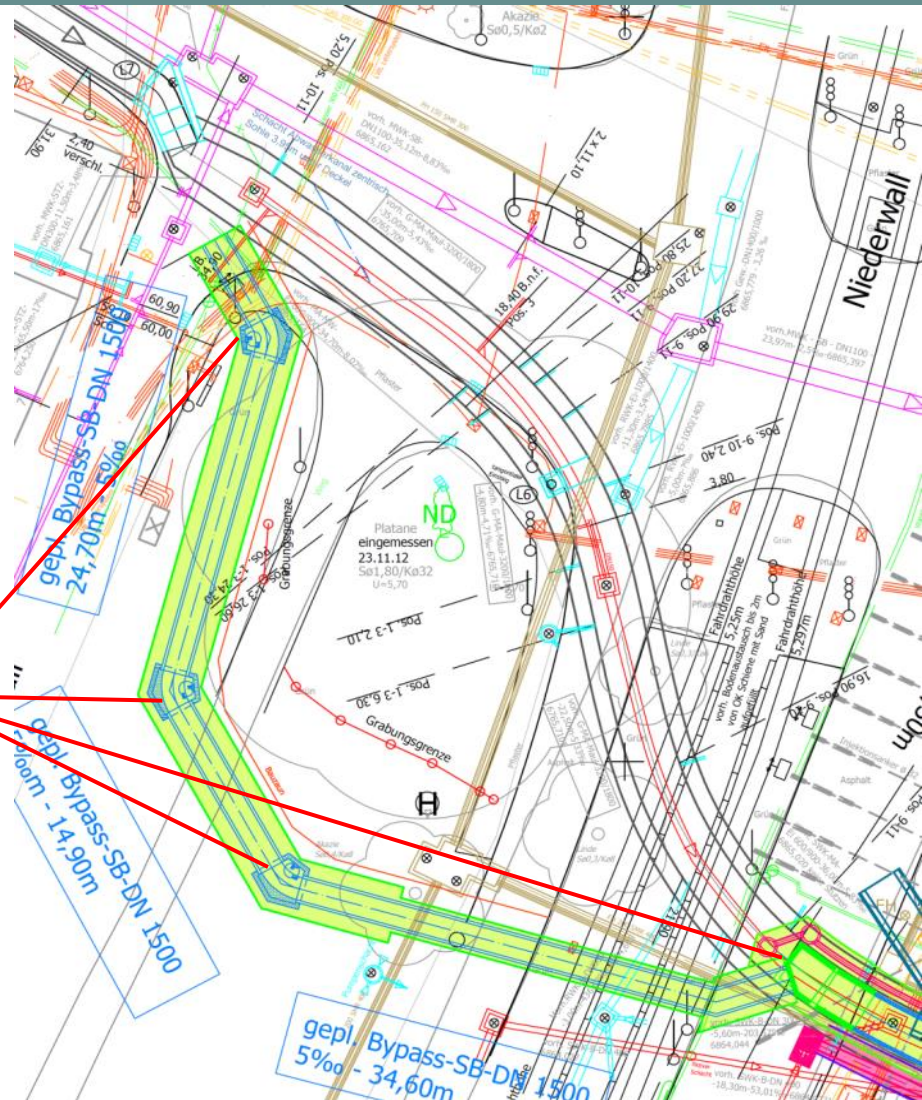

Bearbeitungsstand

- Planung Kanalsanierung der offenen Bauweise wird z. Zt. fertiggestellt
- Entfernung des Baumbestandes in der Ravensberger Straße ist erfolgt
- Überarbeitung der Genehmigungsplanung
- Europaweite Ausschreibung ab ca. April 2014
- Planung der vorbereitenden Verlegung der Versorgungsleitungen
- Beweissicherung der Bebauung (Mitteilung Eigentümer folgt)
- Baubeginn Stadtwerke Mai 2014
- Baubeginn Kanalbau Ende 2014

Geplante Baumaßnahmen

**Straßenausbau / ggf.
Offenlegung Lutter**


**Erneuerung
Versorgungs-
leitungen Süd**

**Erneuerung
SW-Kanal Süd**

**Erneuerung
Weser-Lutter
Kanal**

**Erneuerung
SW-Kanal Nord**

**Erneuerung
Versorgungs-
leitungen Nord**

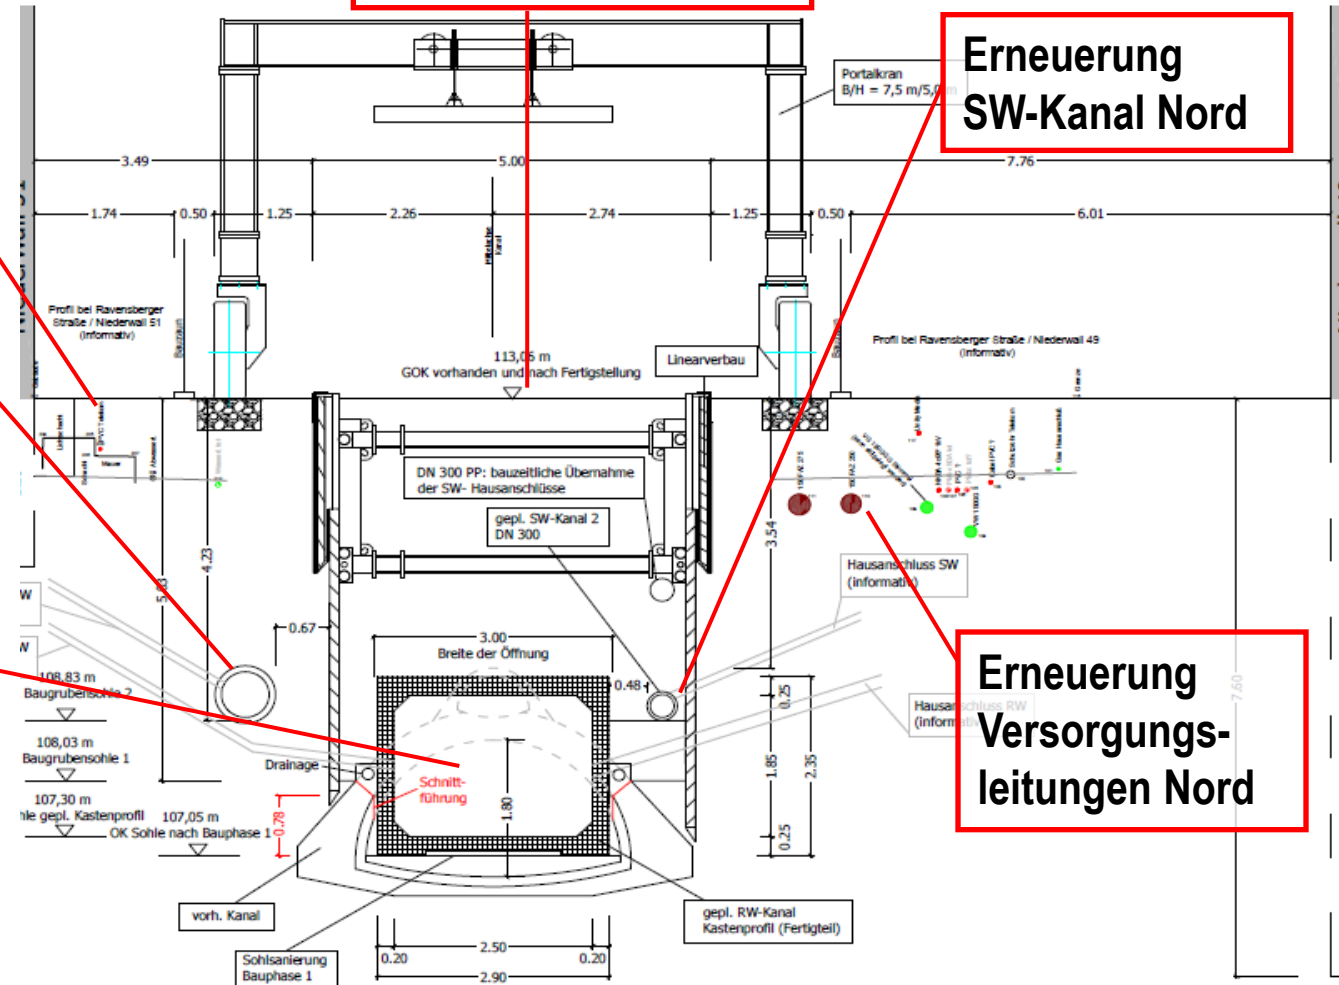

Geplante Baumaßnahmen


2. Bauphase: Offene Sanierung Ziel: Endgültige Ertüchtigung des Kanals



Beispiel: Ravensberger Str. 89

Bauablauf


- 1. Freimachung der
Straßenoberfläche**
- 2. Vorbereitende
Leitungsverlegung**
- 3. Vorlaufende Verlegung
südlicher SW-Kanal**
- 4. Sanierung
Weser-Lutter**
- 5. Abschließende
Leitungsverlegung**
- 6. Wiederherstellung
der Straße
inkl. Offengelegung**

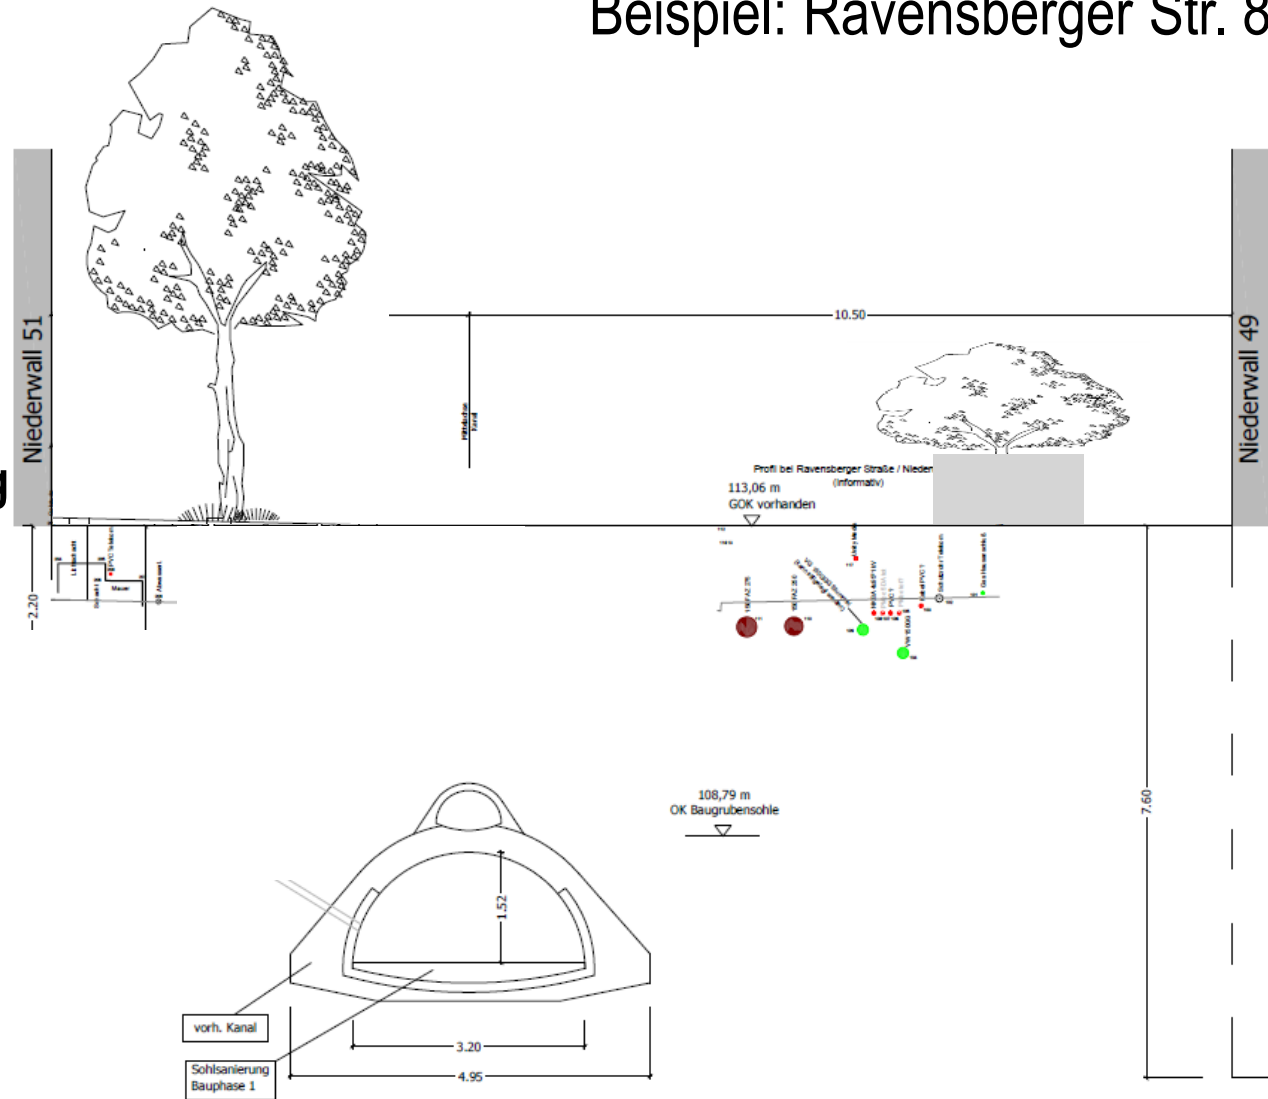

Februar 2014

Bauablauf

1. Freimachung der Straßenoberfläche
2. Vorbereitende Leitungsverlegung
3. Vorlaufende Verlegung südlicher SW-Kanal
4. Sanierung Weser-Lutter
5. Abschließende Leitungsverlegung
6. Wiederherstellung der Straße inkl. Offengelegung

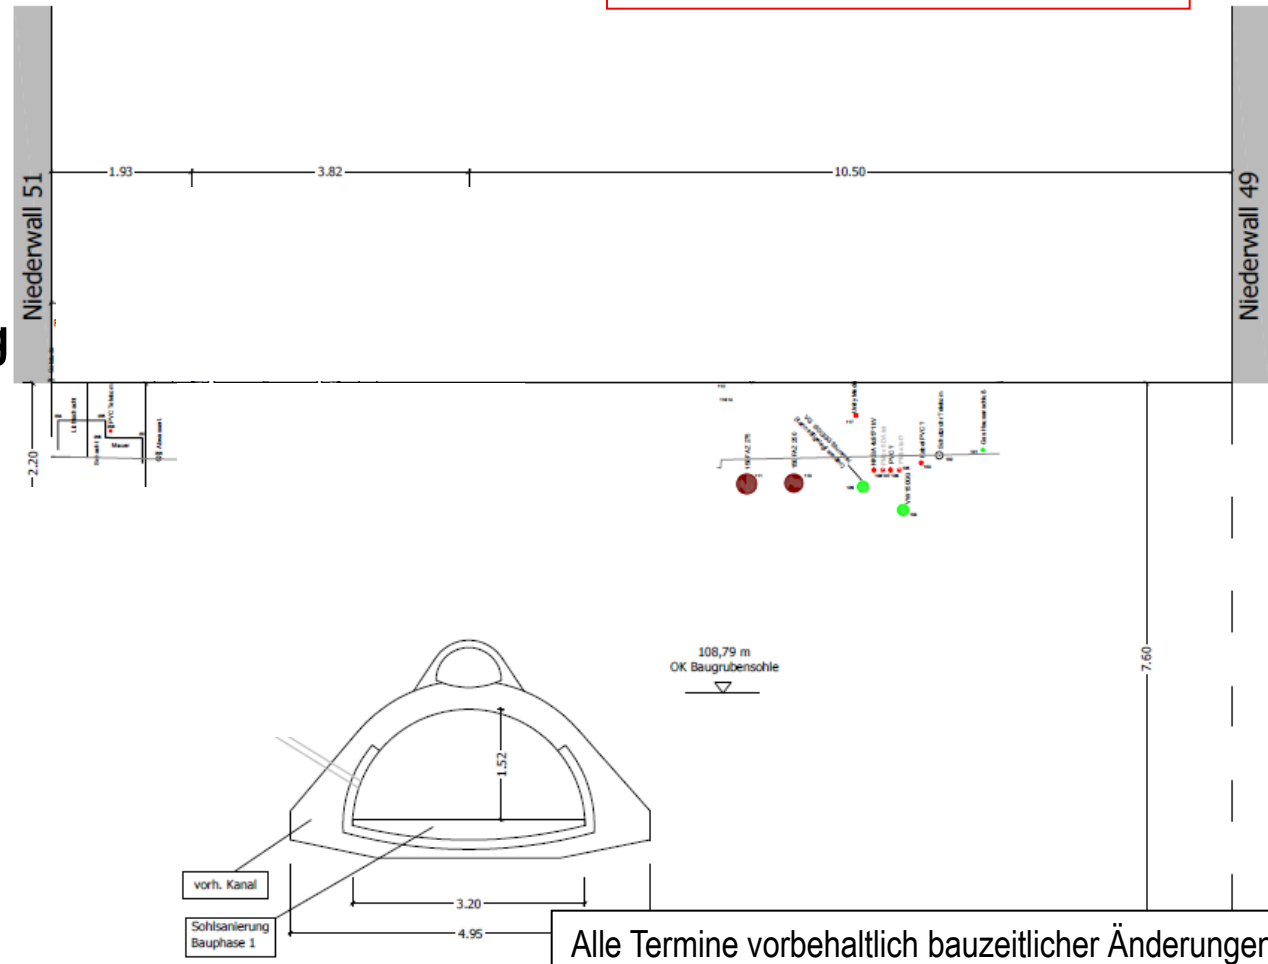


Beispiel: Ravensberger Str. 89

ab Mai 2014

Bauablauf

1. Freimachung der Straßenoberfläche
2. **Vorbereitende Leitungsverlegung**
3. Vorlaufende Verlegung südlicher SW-Kanal
4. Sanierung Weser-Lutter
5. Abschließende Leitungsverlegung
6. Wiederherstellung der Straße inkl. Offengelegung

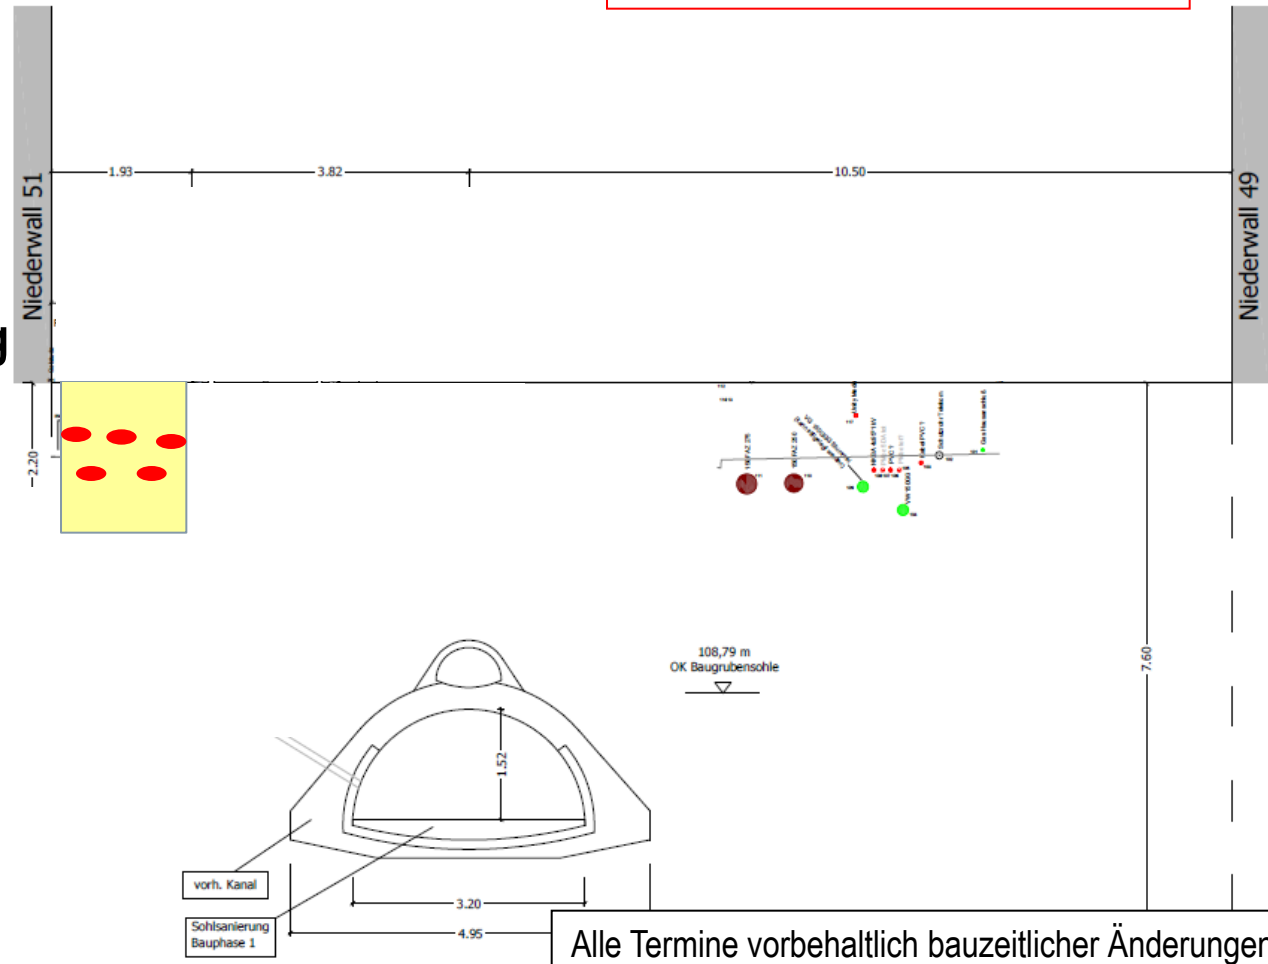


Beispiel: Ravensberger Str. 89

ab Oktober 2014

Bauablauf


1. Freimachung der Straßenoberfläche
2. Vorbereitende Leitungsverlegung
3. **Vorlaufende Verlegung südlicher SW-Kanal**
4. Sanierung Weser-Lutter
5. Abschließende Leitungsverlegung
6. Wiederherstellung der Straße inkl. Offengelegung

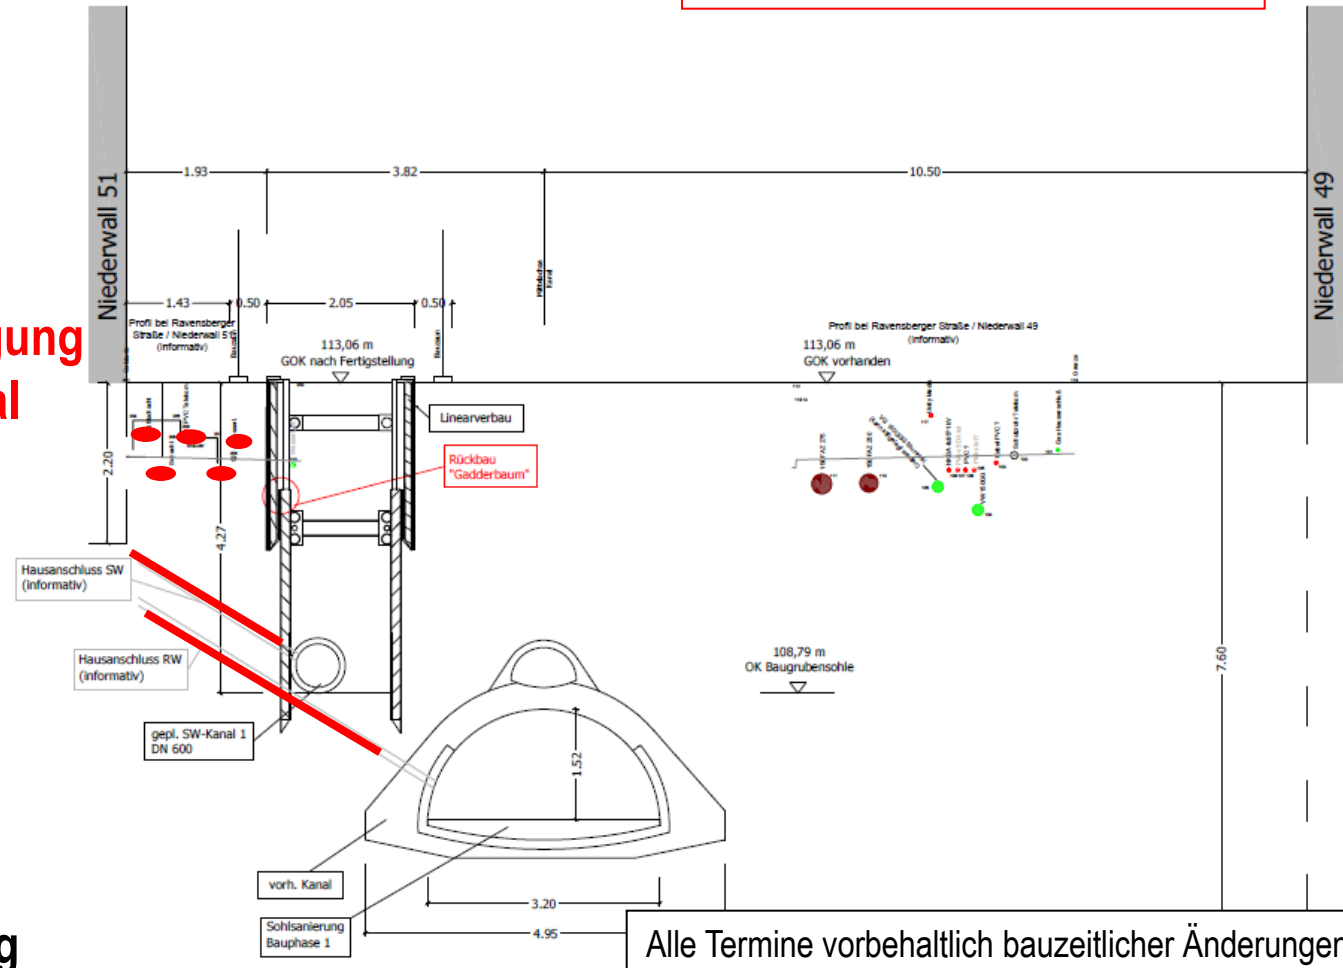

ab Januar 2015

Bauablauf

1. Freimachung der Straßenoberfläche
2. Vorbereitende Leitungsverlegung
3. Vorlaufende Verlegung südlicher SW-Kanal
4. **Sanierung Weser-Lutter**
5. Abschließende Leitungsverlegung
6. Wiederherstellung der Straße inkl. Offengelegung

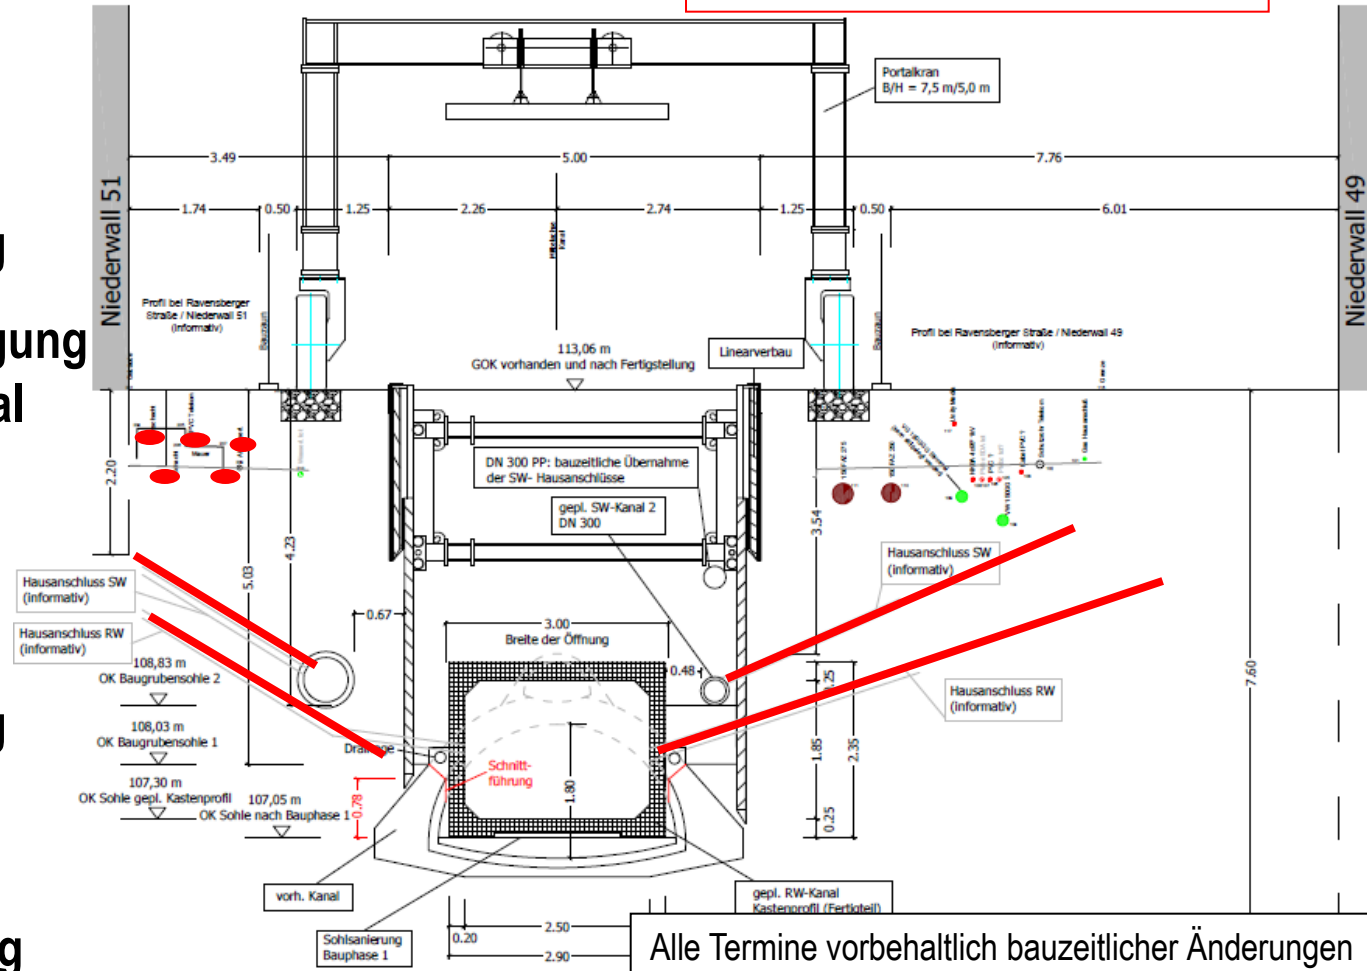


Beispiel: Ravensberger Str. 89

ab Mitte 2016

Bauablauf

1. Freimachung der Straßenoberfläche
2. Vorbereitende Leitungsverlegung
3. Vorlaufende Verlegung südlicher SW-Kanal
4. Sanierung Weser-Lutter
5. **Abschließende Leitungsverlegung**
6. Wiederherstellung der Straße
inkl. Offenlegung

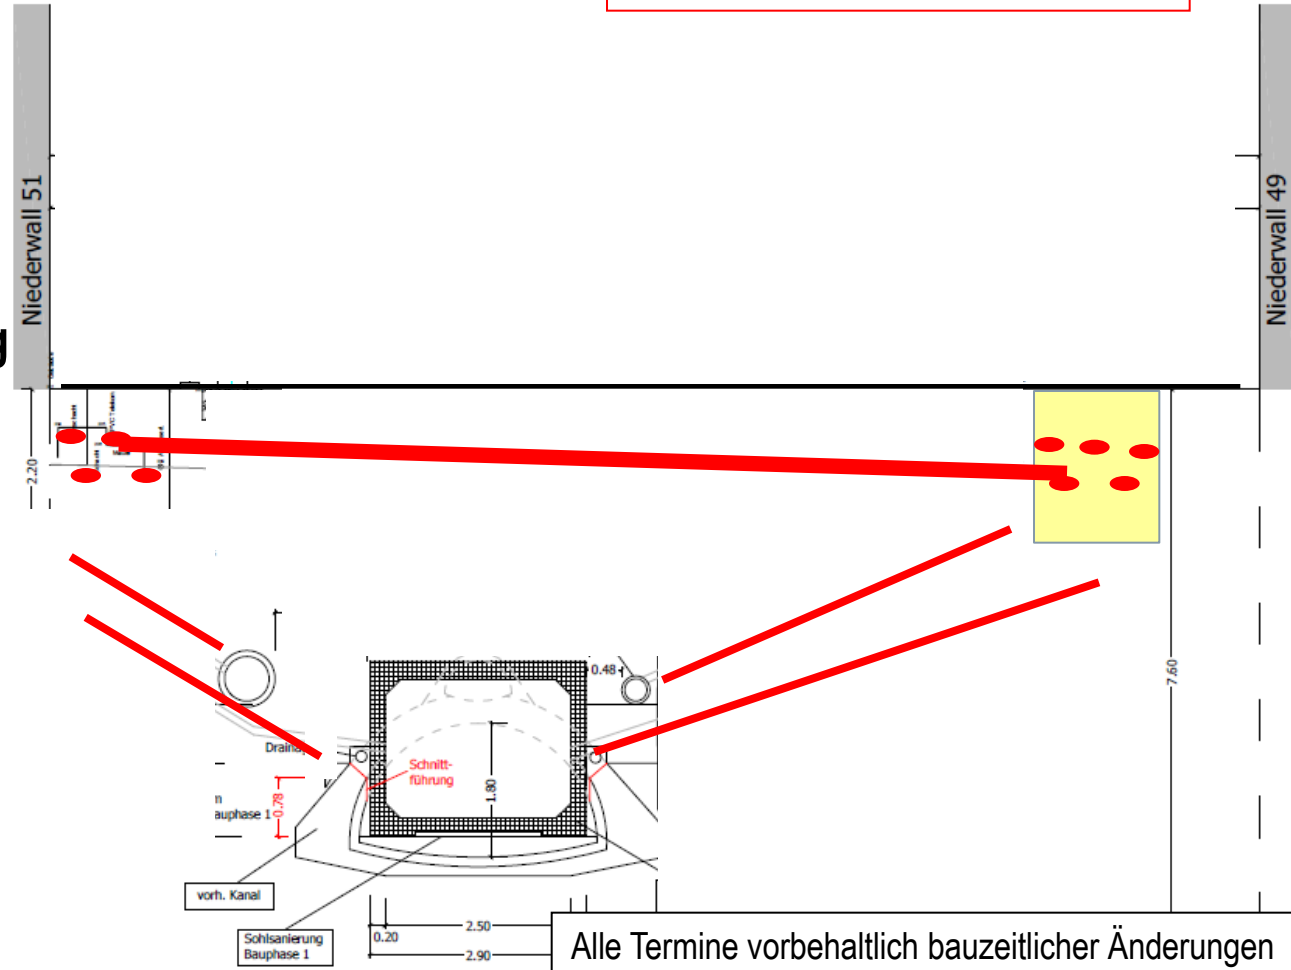


Bauablauf


1. Freimachung der Straßenoberfläche
2. Vorbereitende Leitungsverlegung
3. Vorlaufende Verlegung südlicher SW-Kanal
4. Sanierung Weser-Lutter
5. Abschließende Leitungsverlegung
6. **Wiederherstellung der Straße inkl. Offenlegung**

Beispiel: Ravensberger Str. 89

ab Mitte 2017

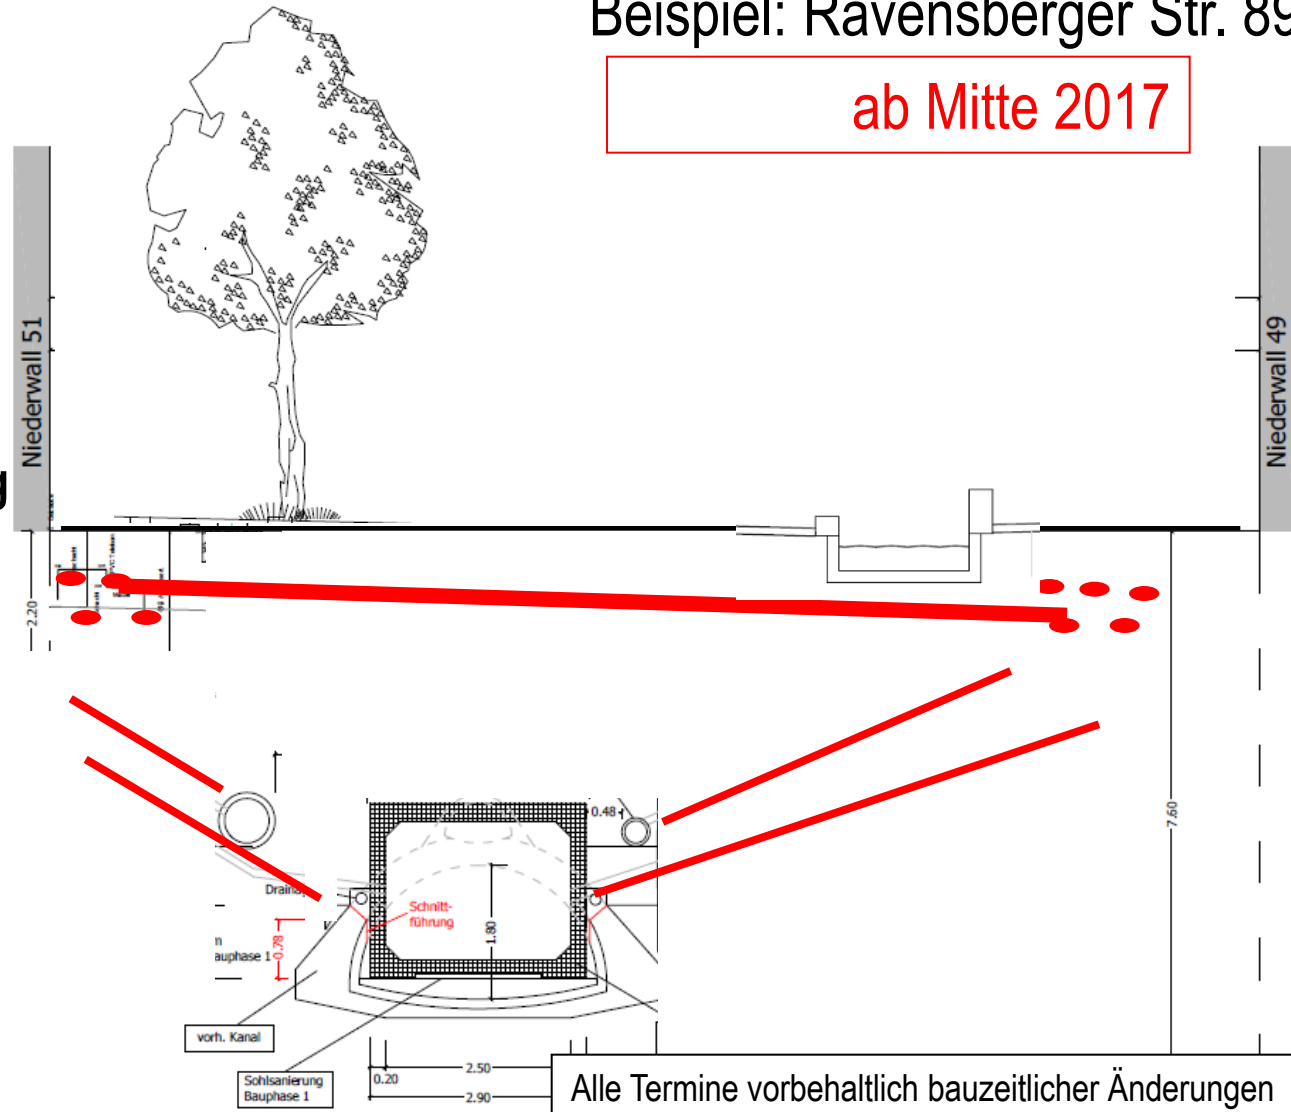


Baubereich 2014-2018

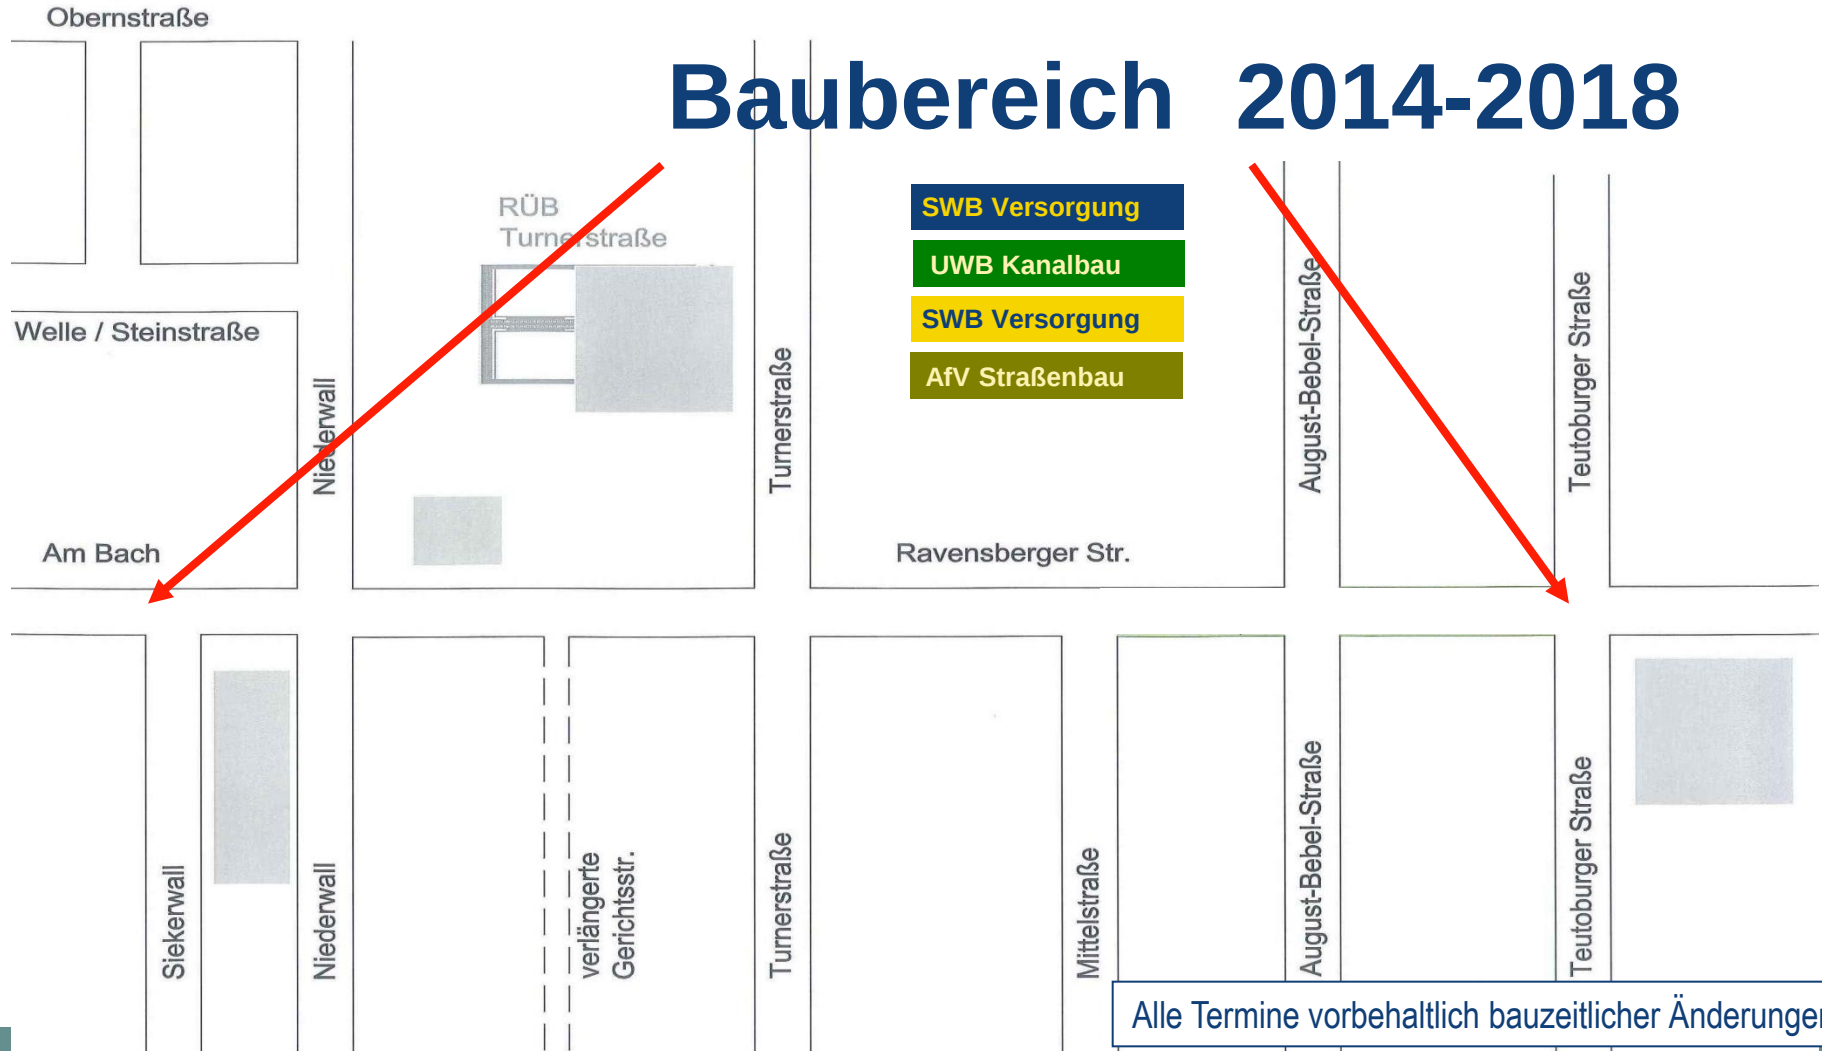

Alle Termine vorbehaltlich bauzeitlicher Änderungen


Bauabfolge 2014

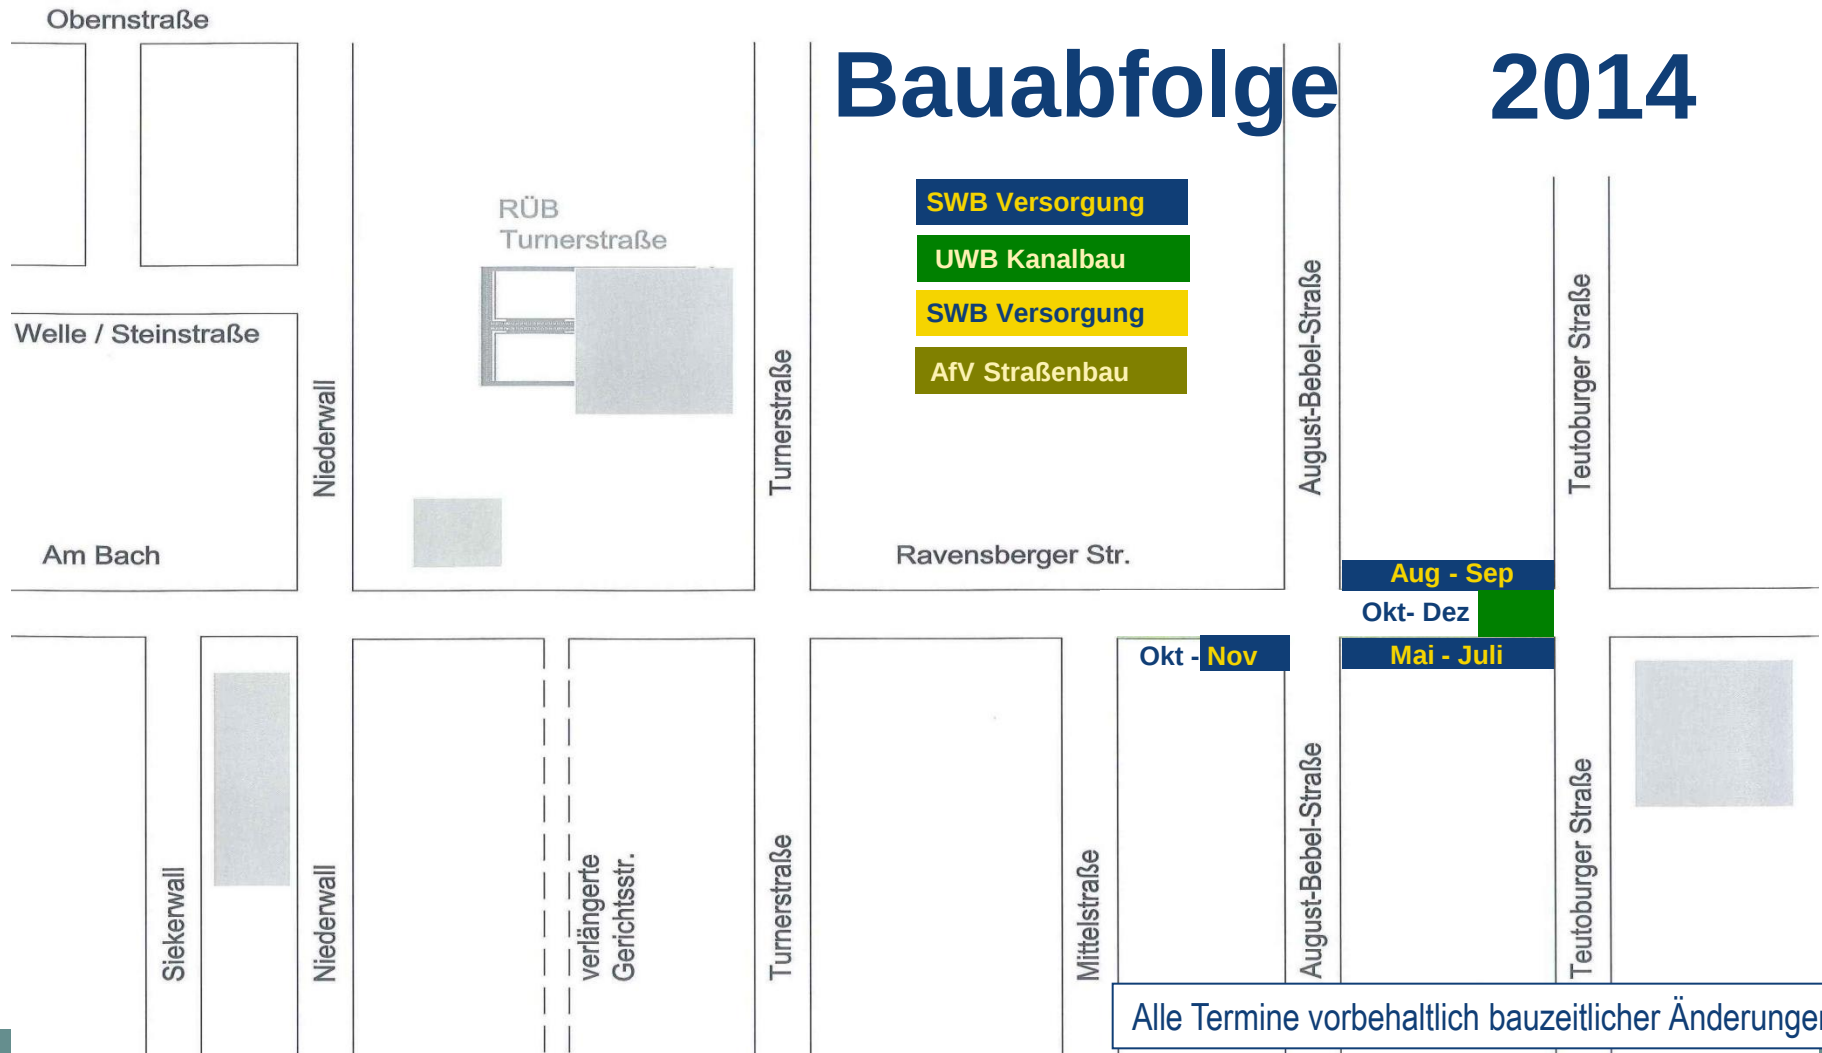


Alle Termine vorbehaltlich bauzeitlicher Änderungen

Übersicht

2014

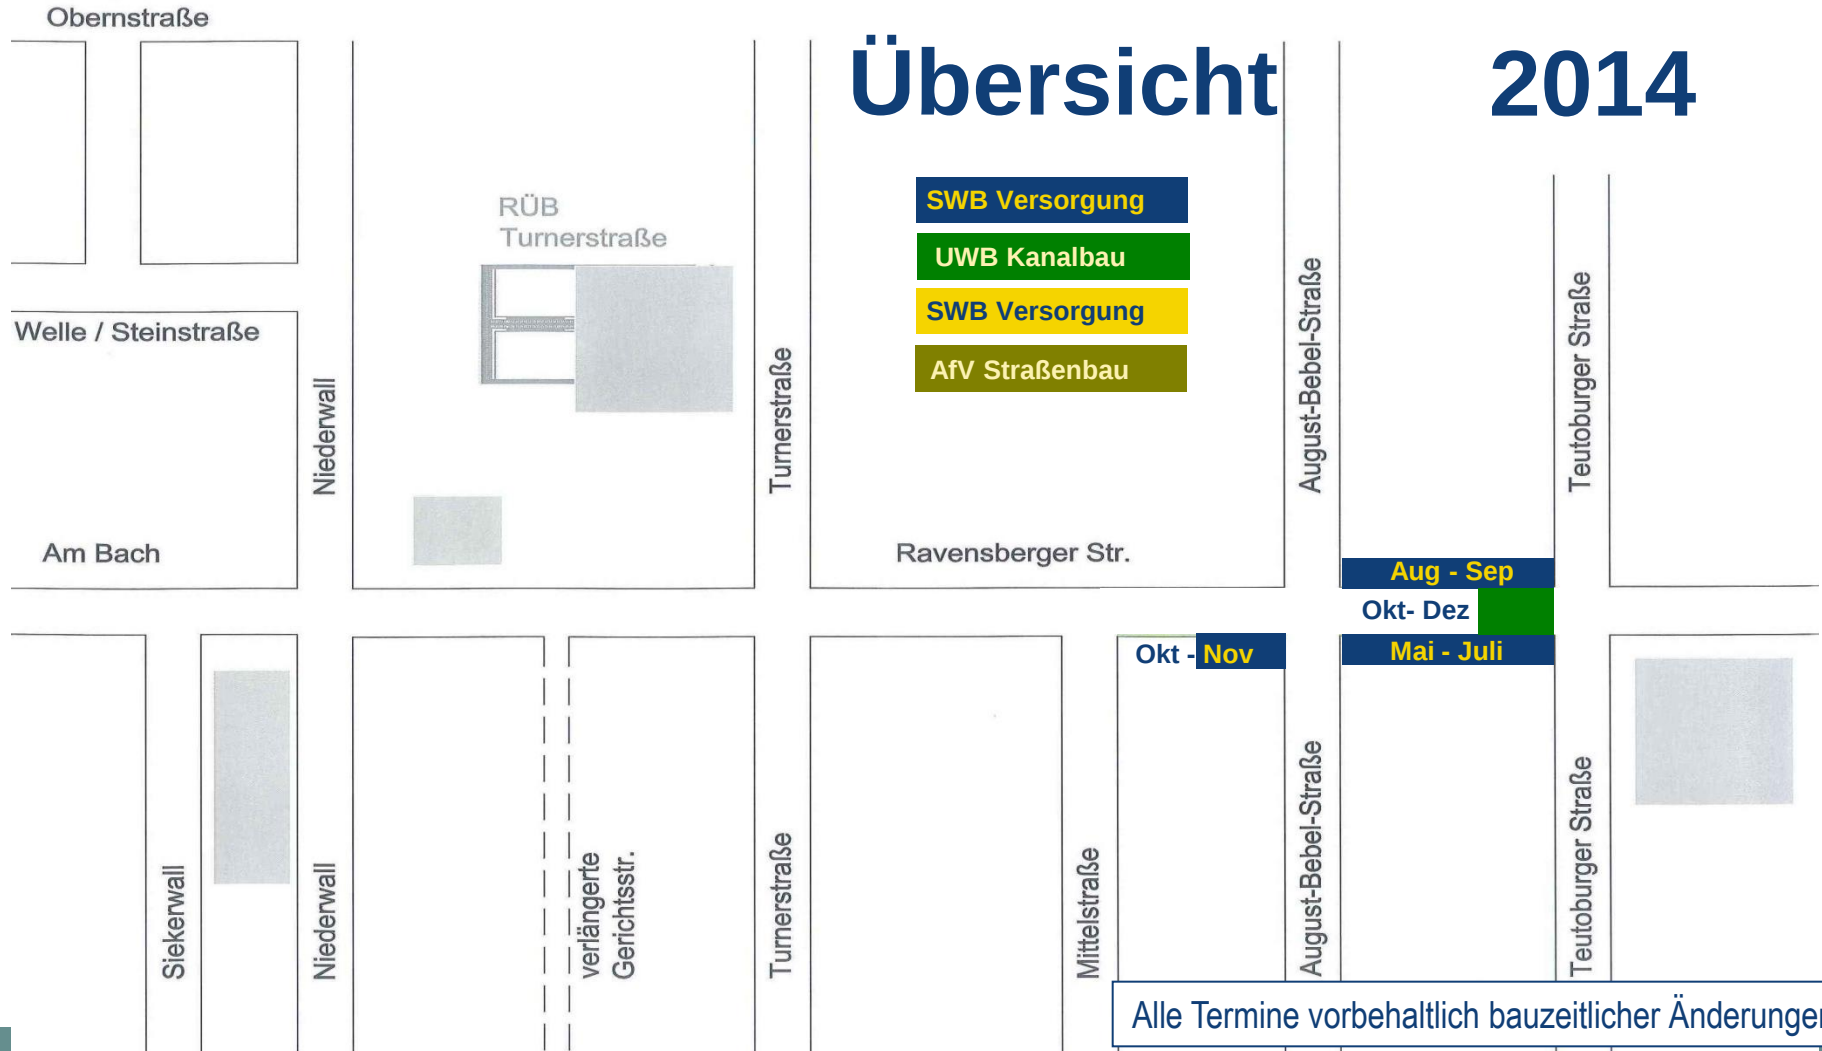


Bauabfolge 2015

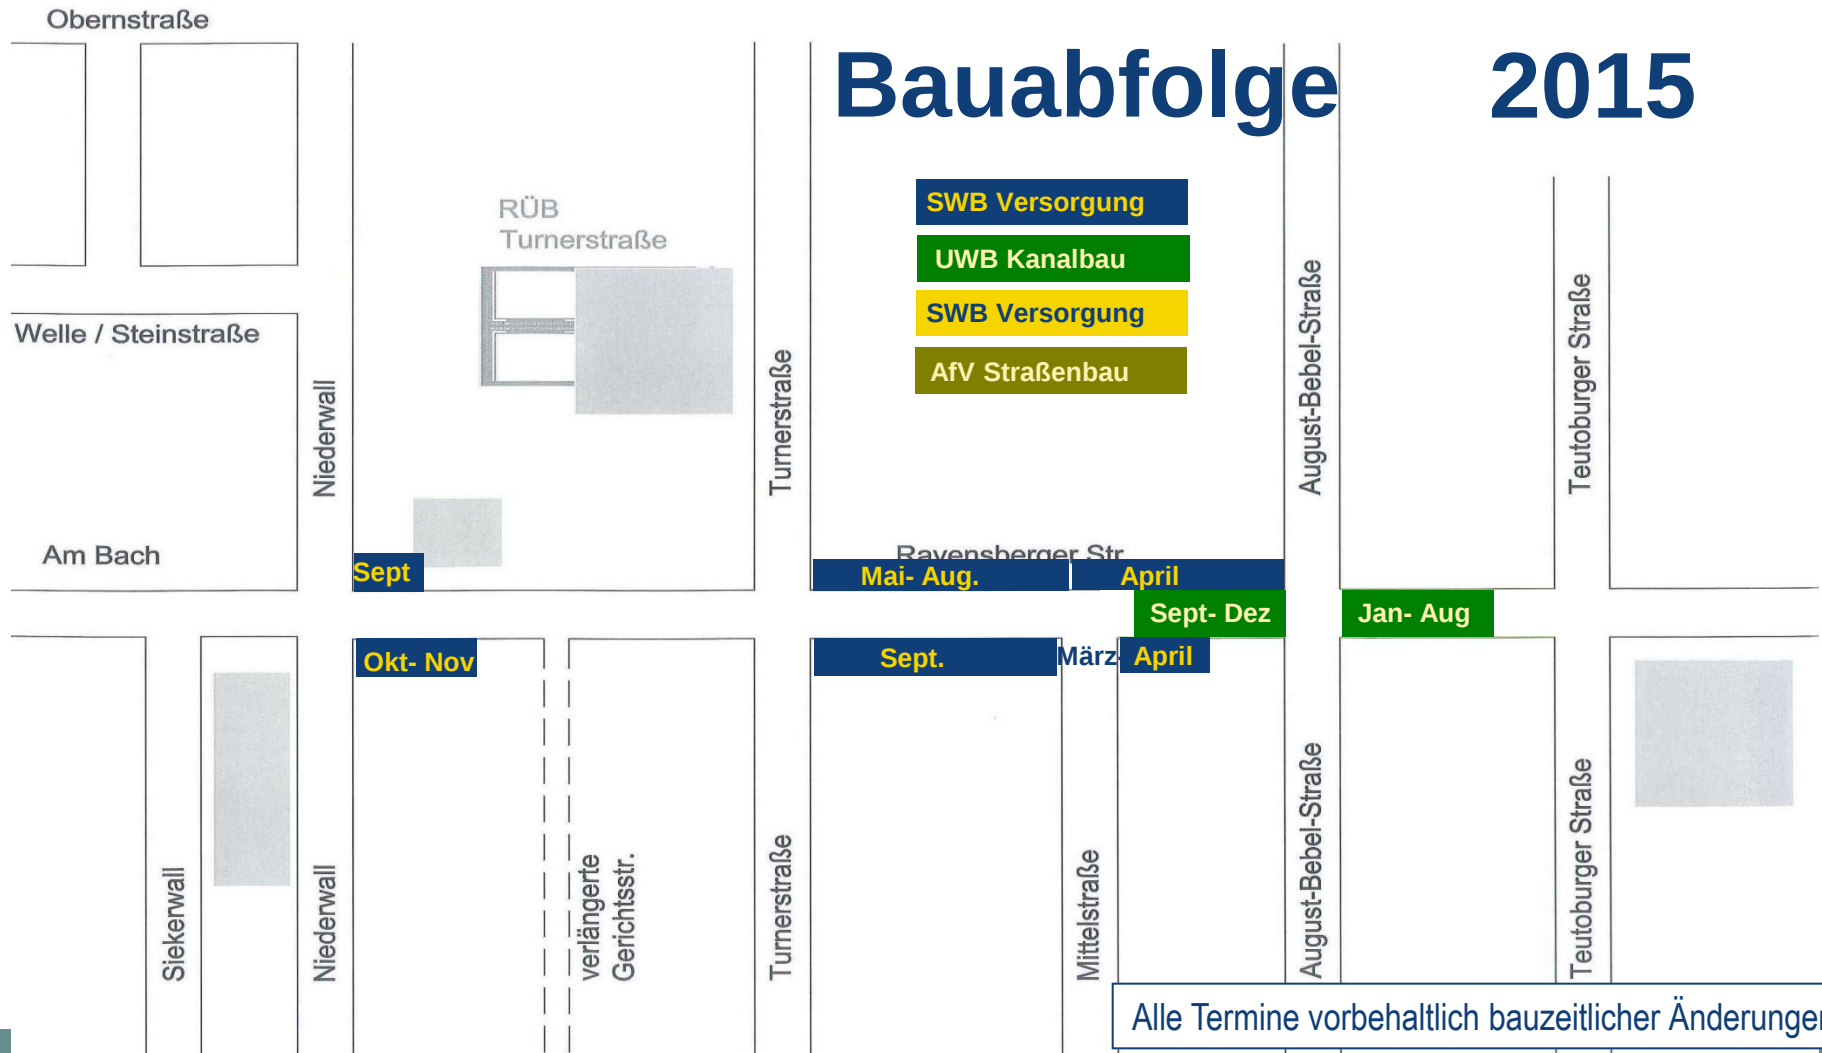

Alle Termine vorbehaltlich bauzeitlicher Änderungen




Bauabfolge 2016

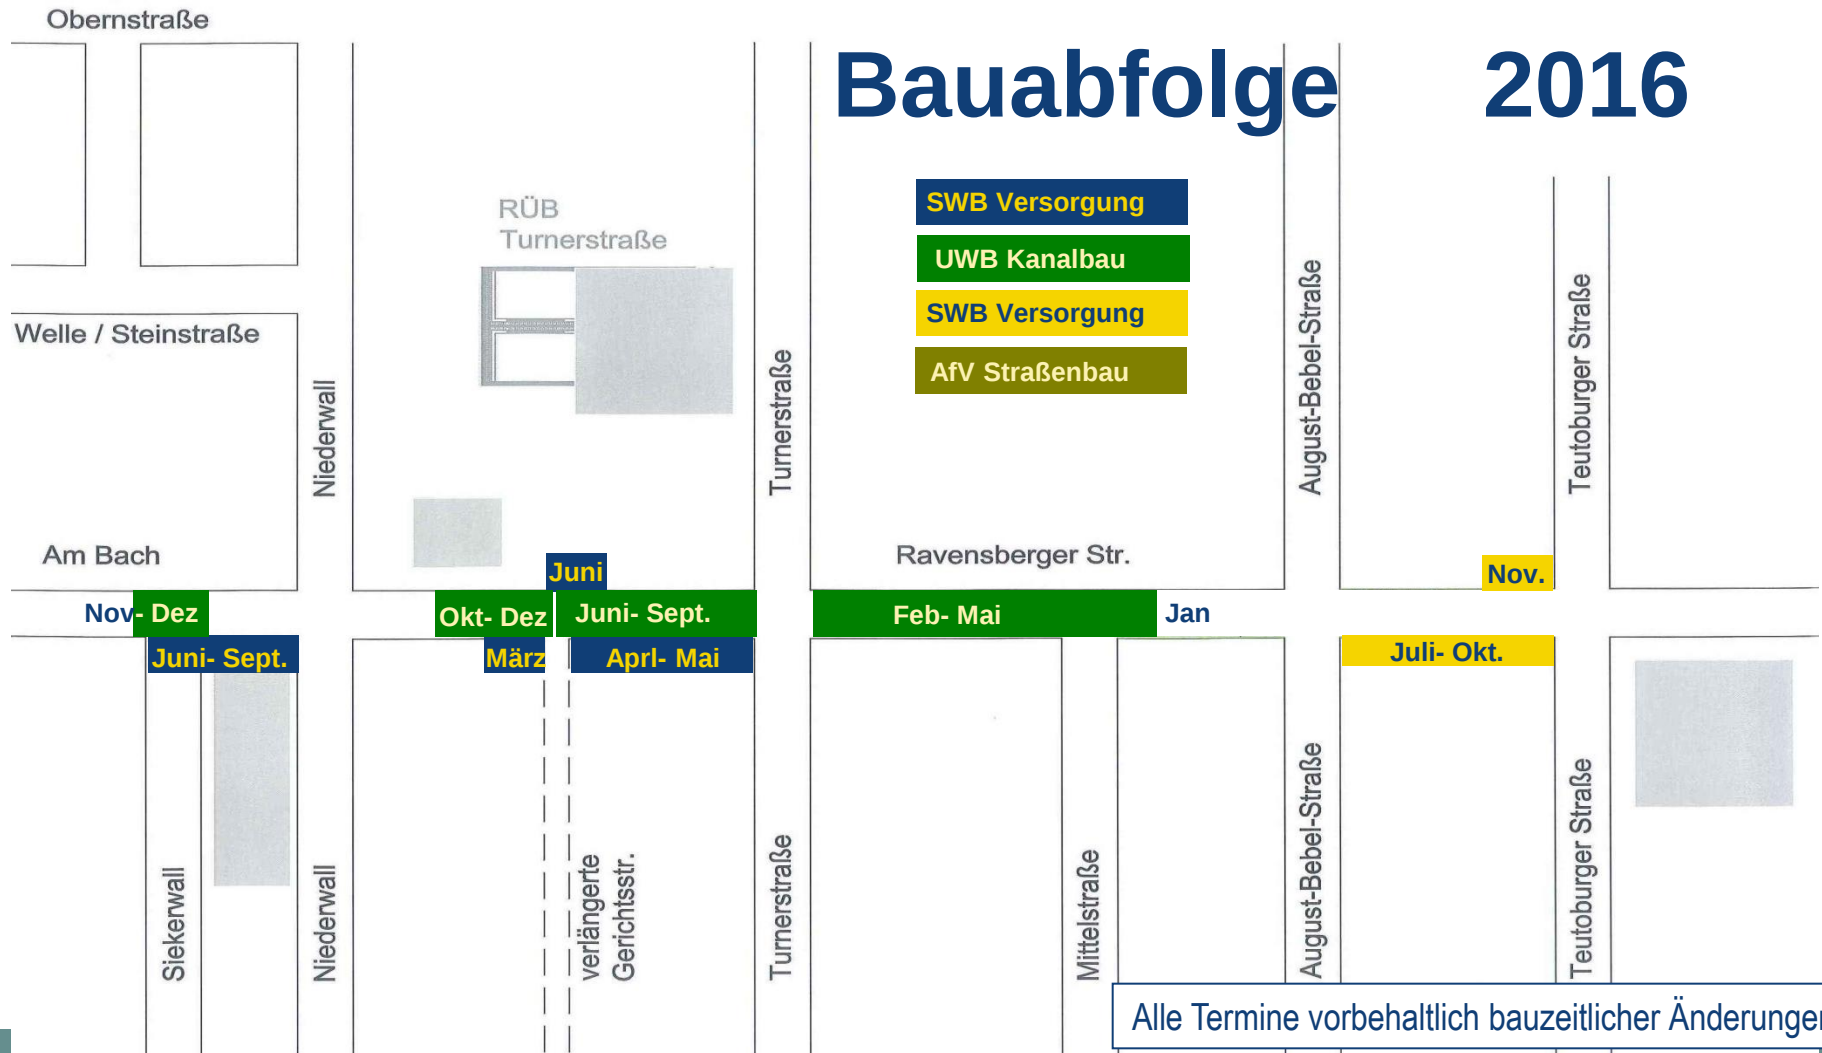


Alle Termine vorbehaltlich bauzeitlicher Änderungen

Übersicht 2016

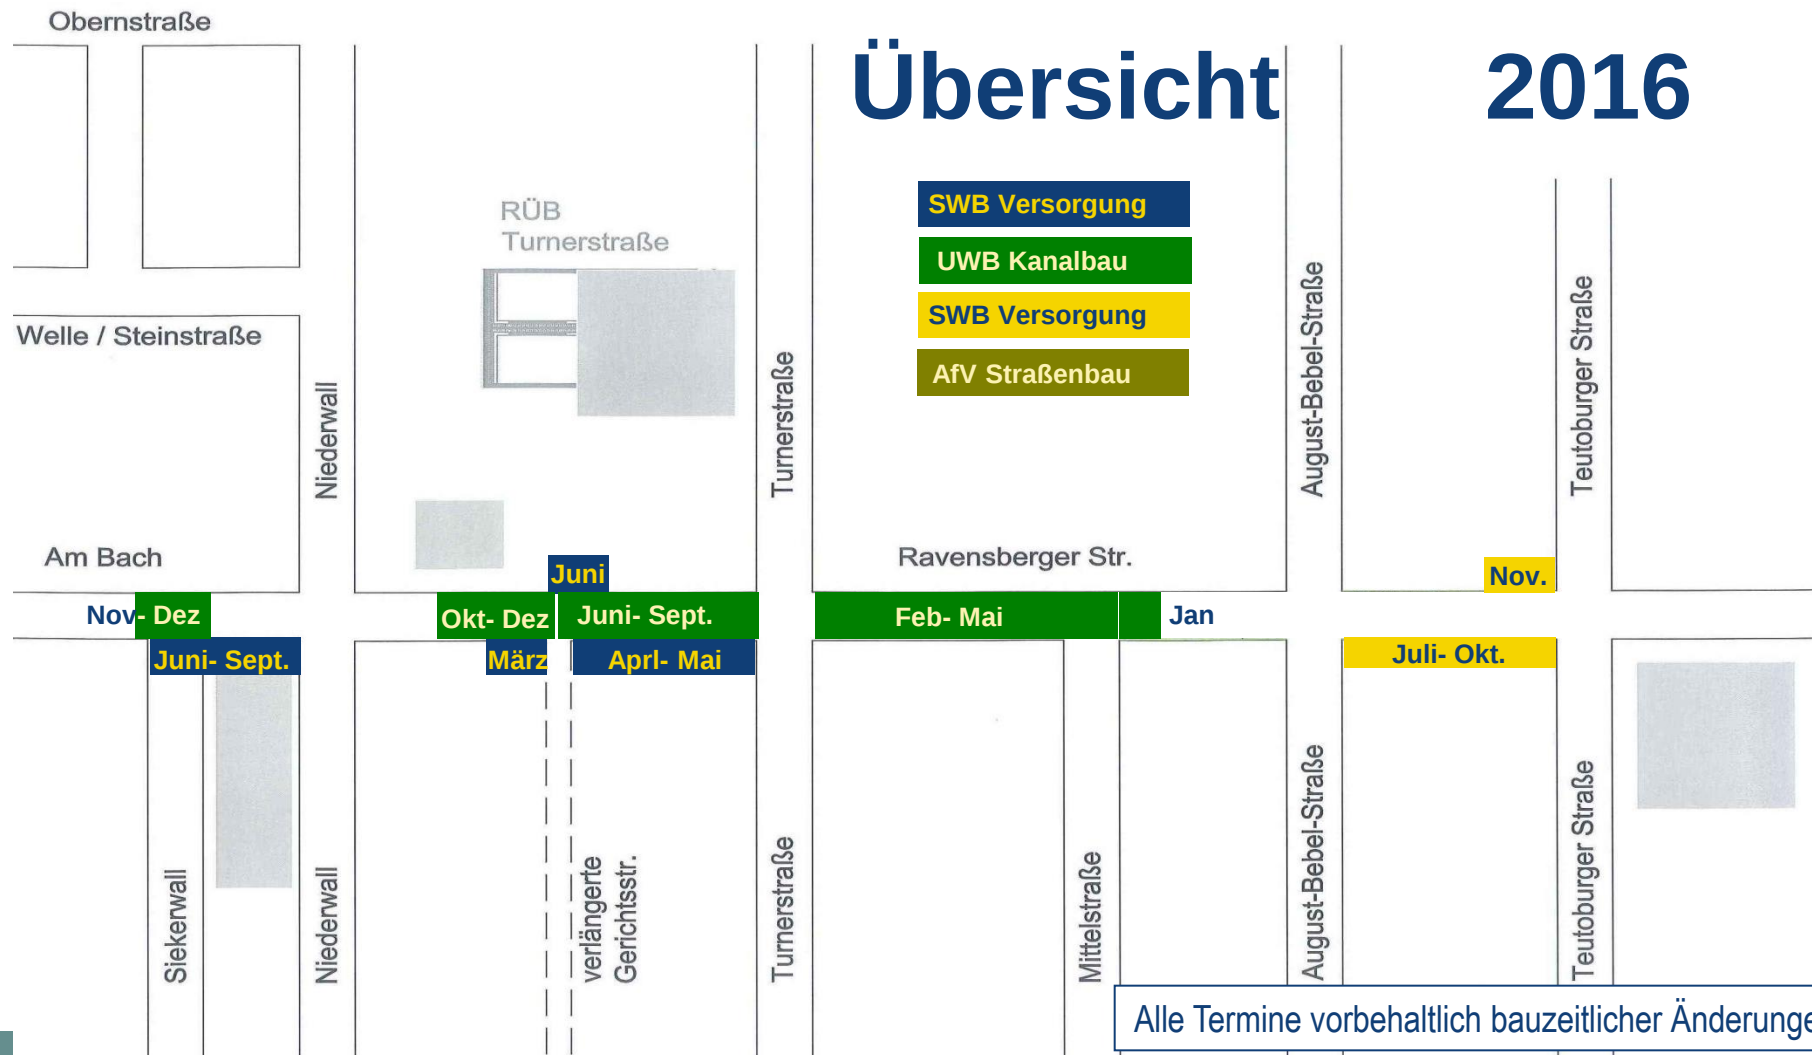


Alle Termine vorbehaltlich bauzeitlicher Änderungen

Bauabfolge 2017

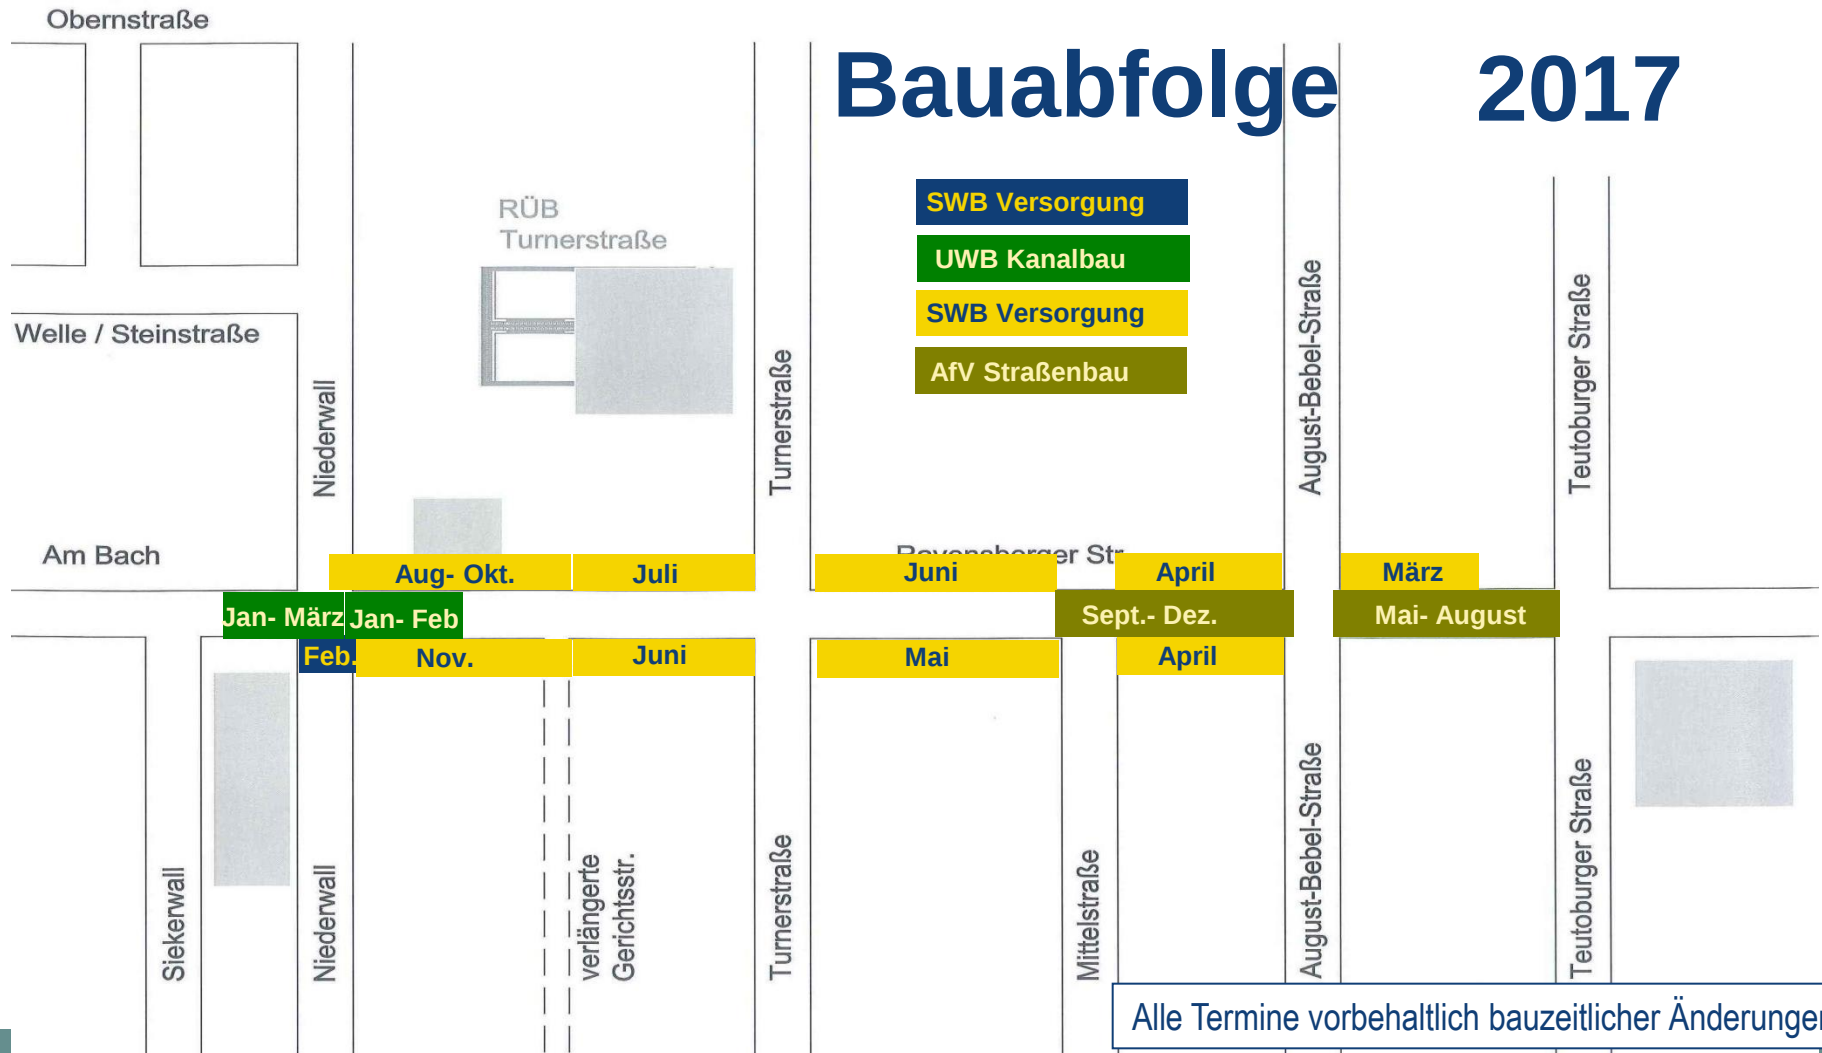


Alle Termine vorbehaltlich bauzeitlicher Änderungen

Übersicht | 2017

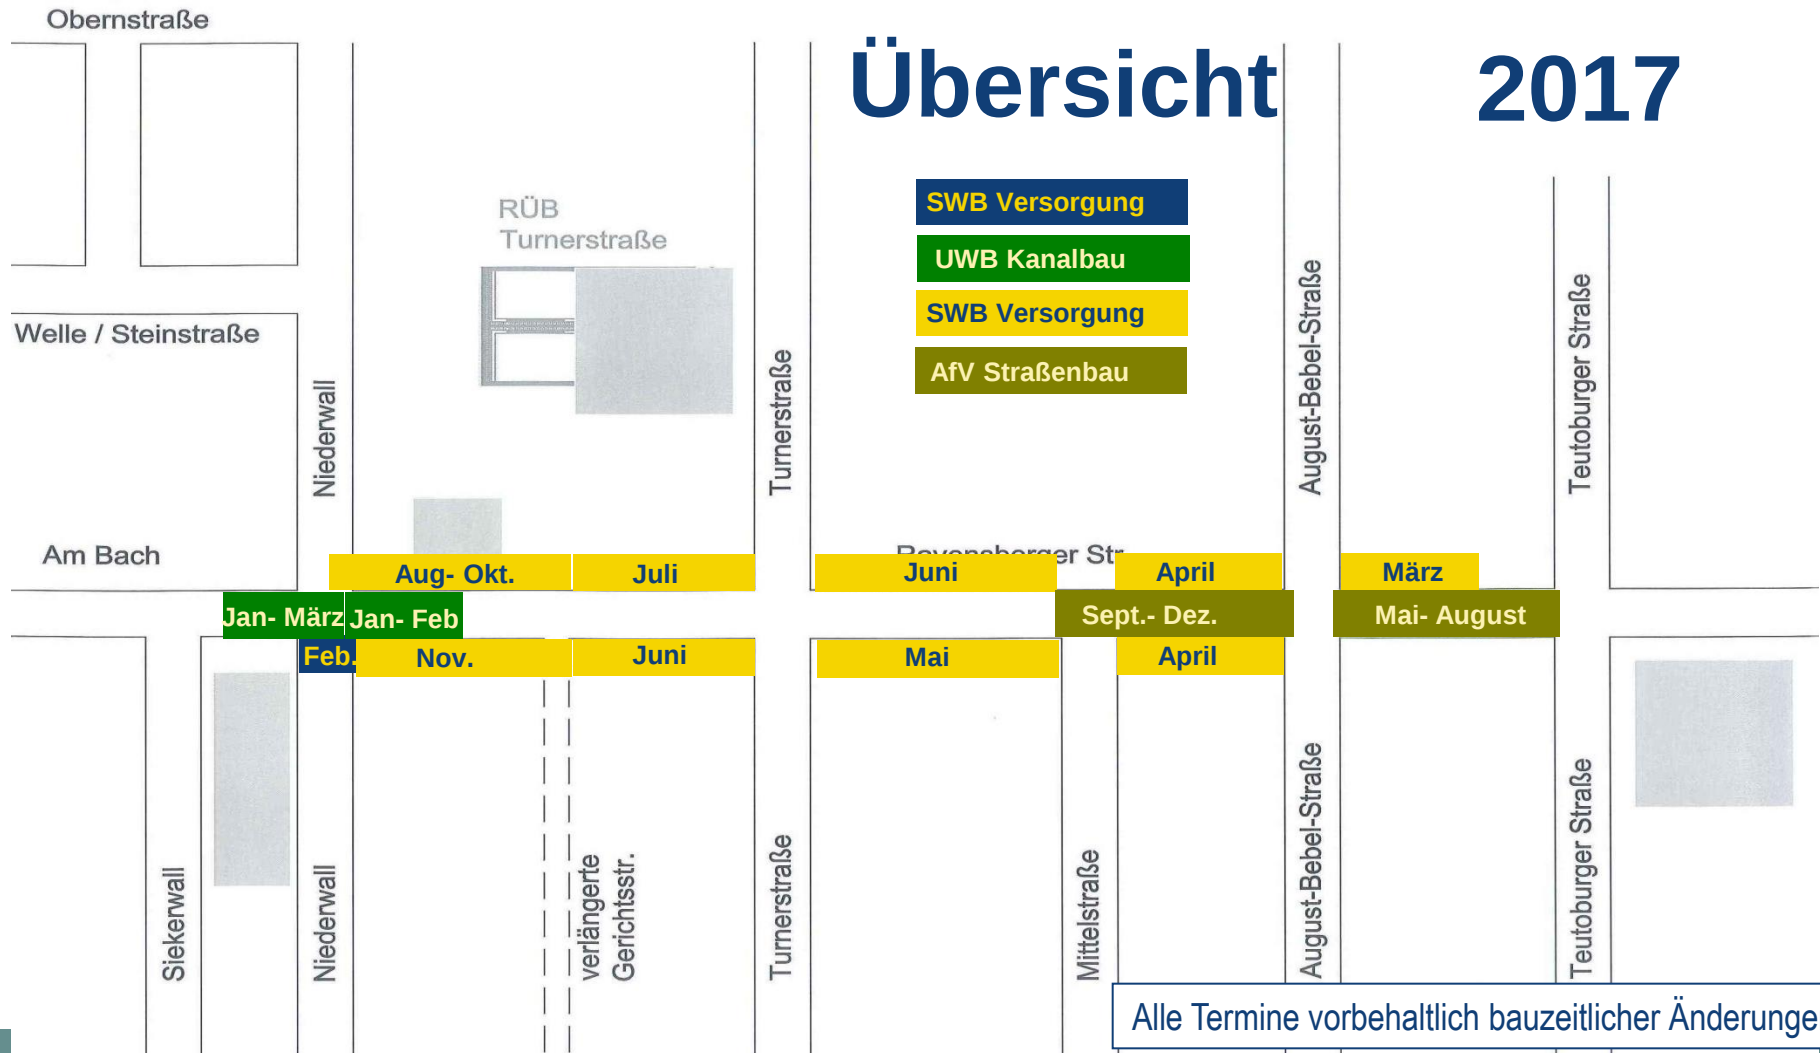


Bauabfolge 2018

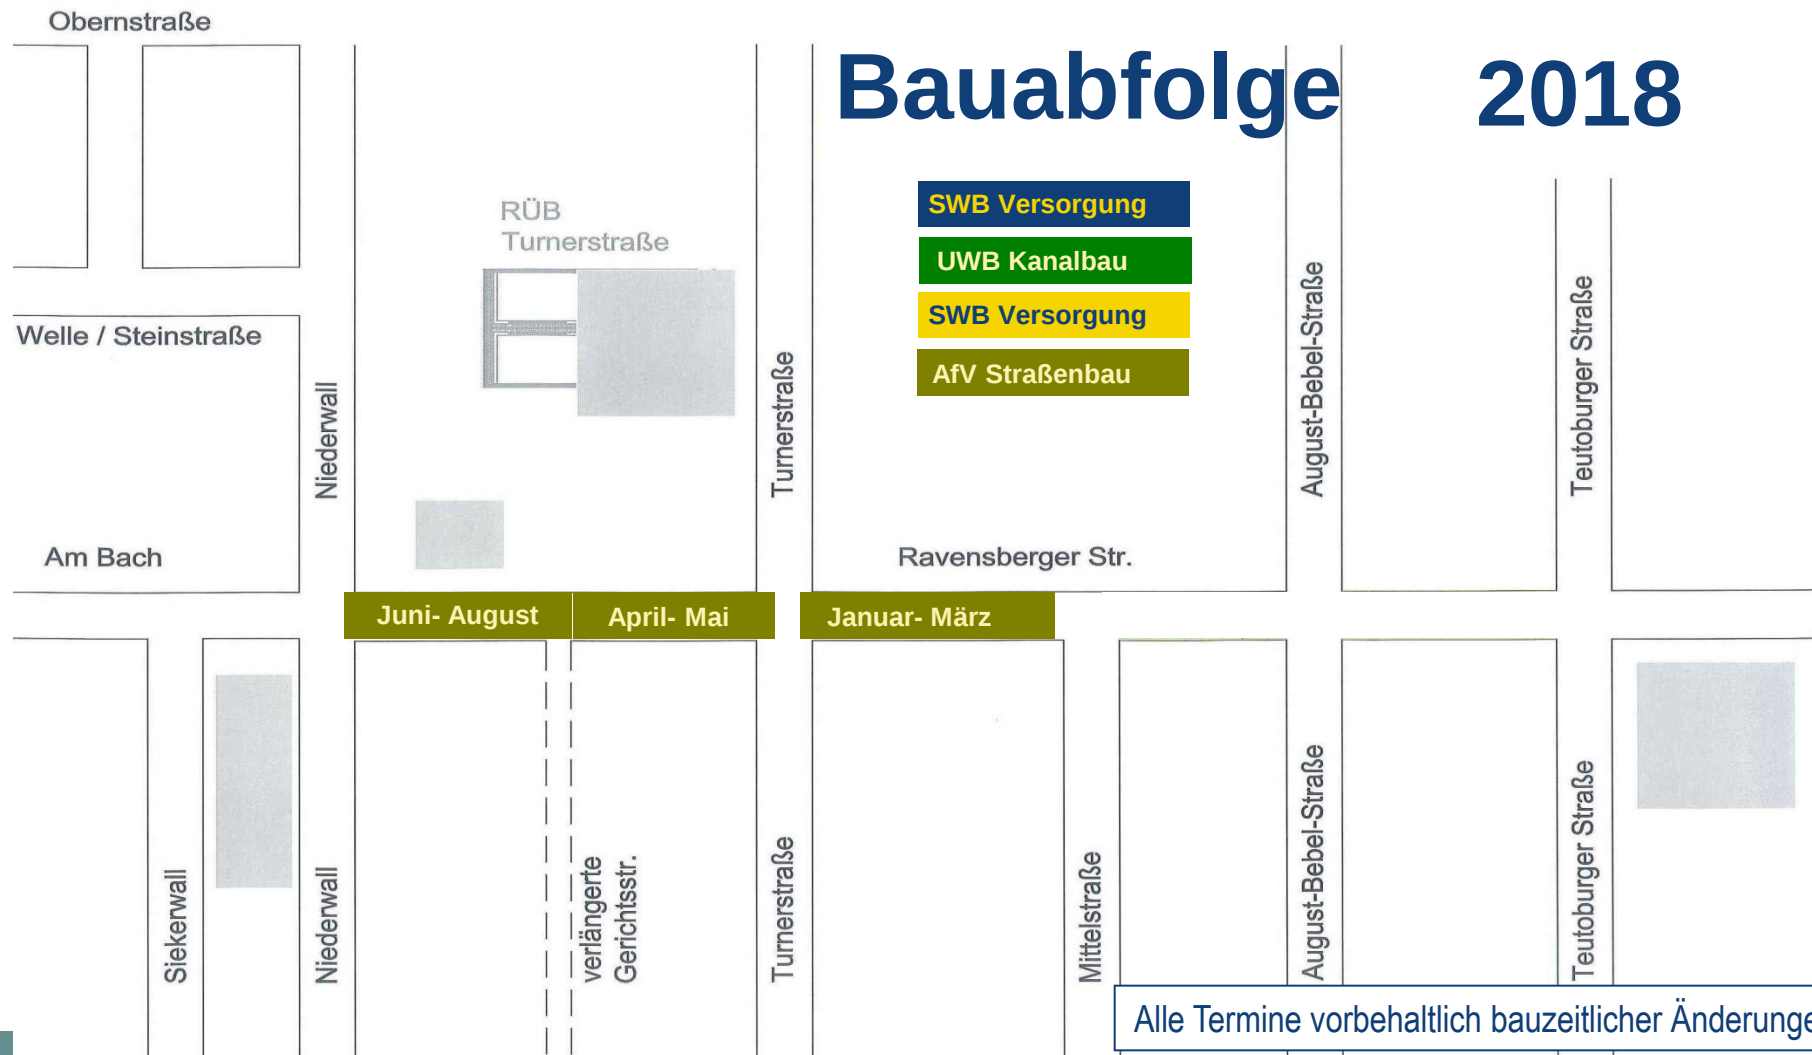

Übersicht

2018

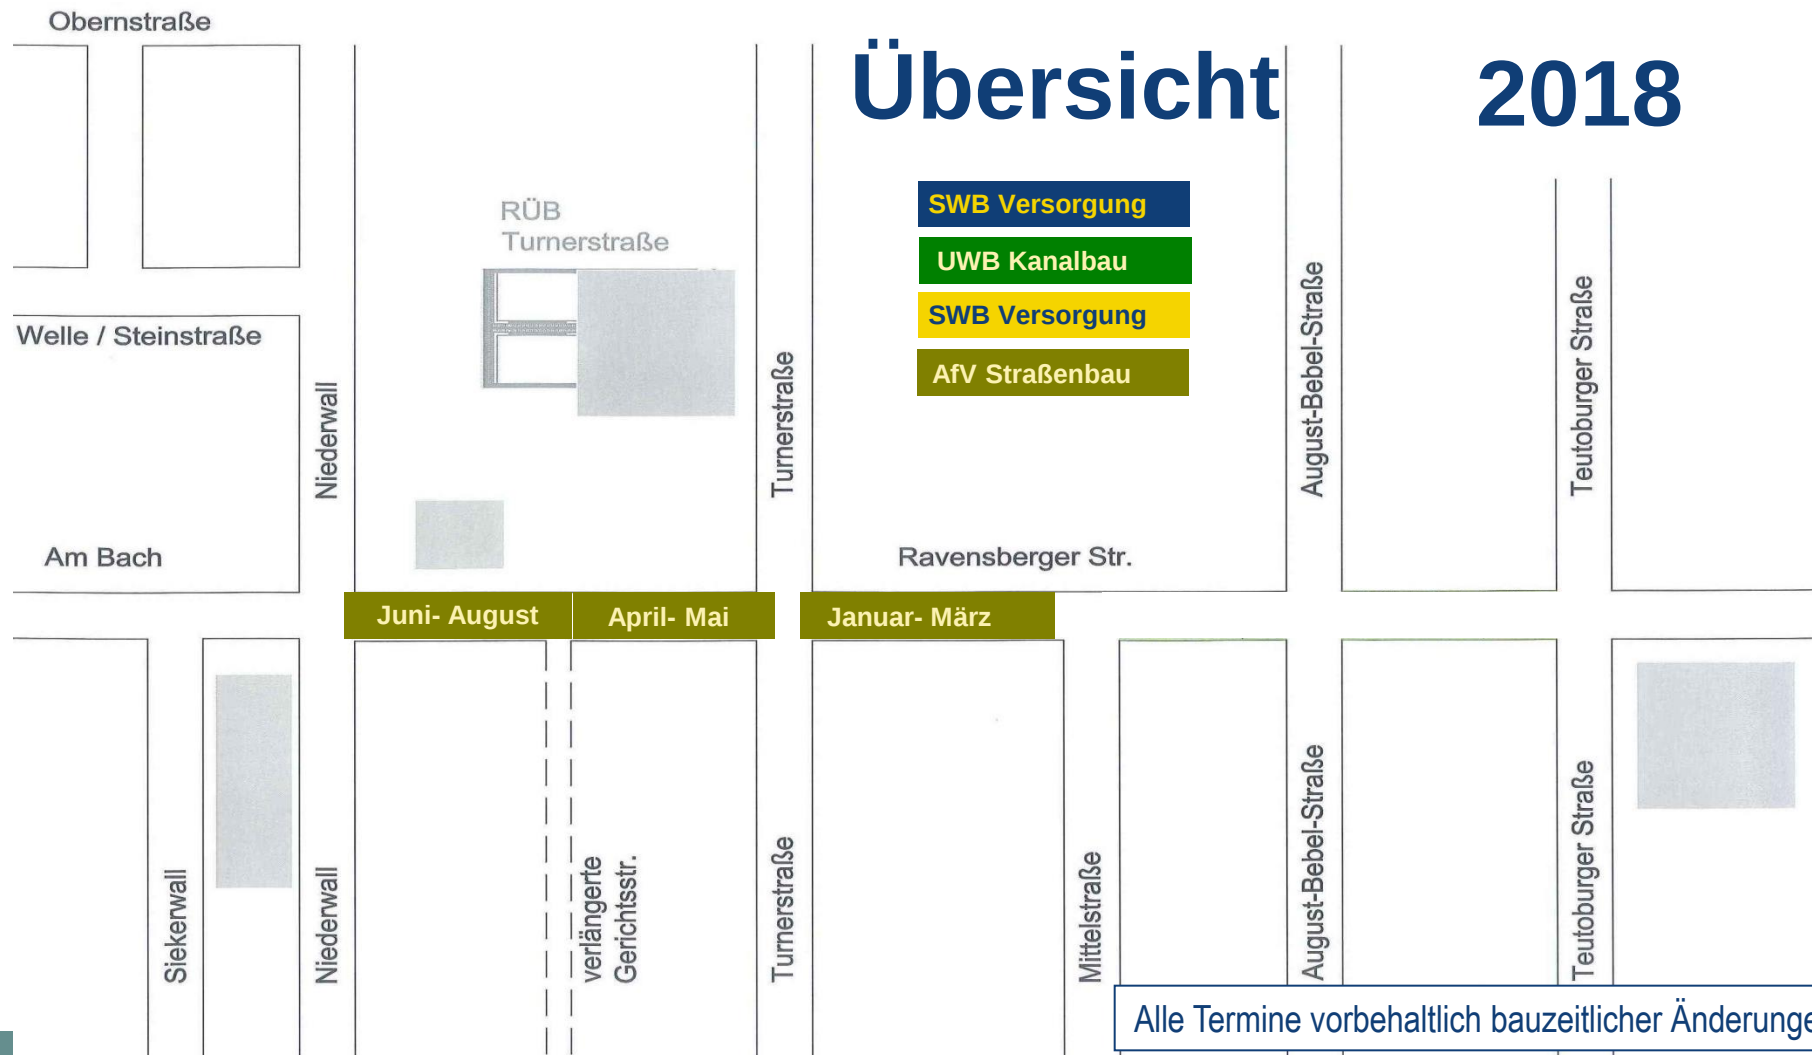

Alle Termine vorbehaltlich bauzeitlicher Änderungen

Auswirkungen auf die Ravensberger Str. - Zugänglichkeit

- Zugänglichkeit zu den Häusern:
während der Baumaßnahmen kontinuierlich sichergestellt
- Anfahrbarkeit der Häuser:
während der Baumaßnahmen eingeschränkt
- Vorlaufende direkte Ankündigungen an die Anlieger

Auswirkungen auf die Ravensberger Str. - Feuerwehr

- Planung findet in Abstimmung mit der Feuerwehr statt
- Anleiterbarkeit bzw. Rettung aus den Häusern muss
kontinuierlich sichergestellt sein.

Informationen während der Baumaßnahme:

- Es wird ein zentrales Informationsbüro vor Ort **ab ca. Oktober 2014** eingerichtet.
- Besetzung mit Fachkundigen des UWB
- Entgegennahme von Fragen, Anregungen, Hinweisen
- Ggf. Weiterleitung und Organisation der Beantwortung





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
