


Naturnaher und hochwassersicherer Ausbau der Lutter in Bielefeld - Heepen

Bezirksvertretung Heepen am 21.06.2018 - Sachstandsbericht

Übersicht

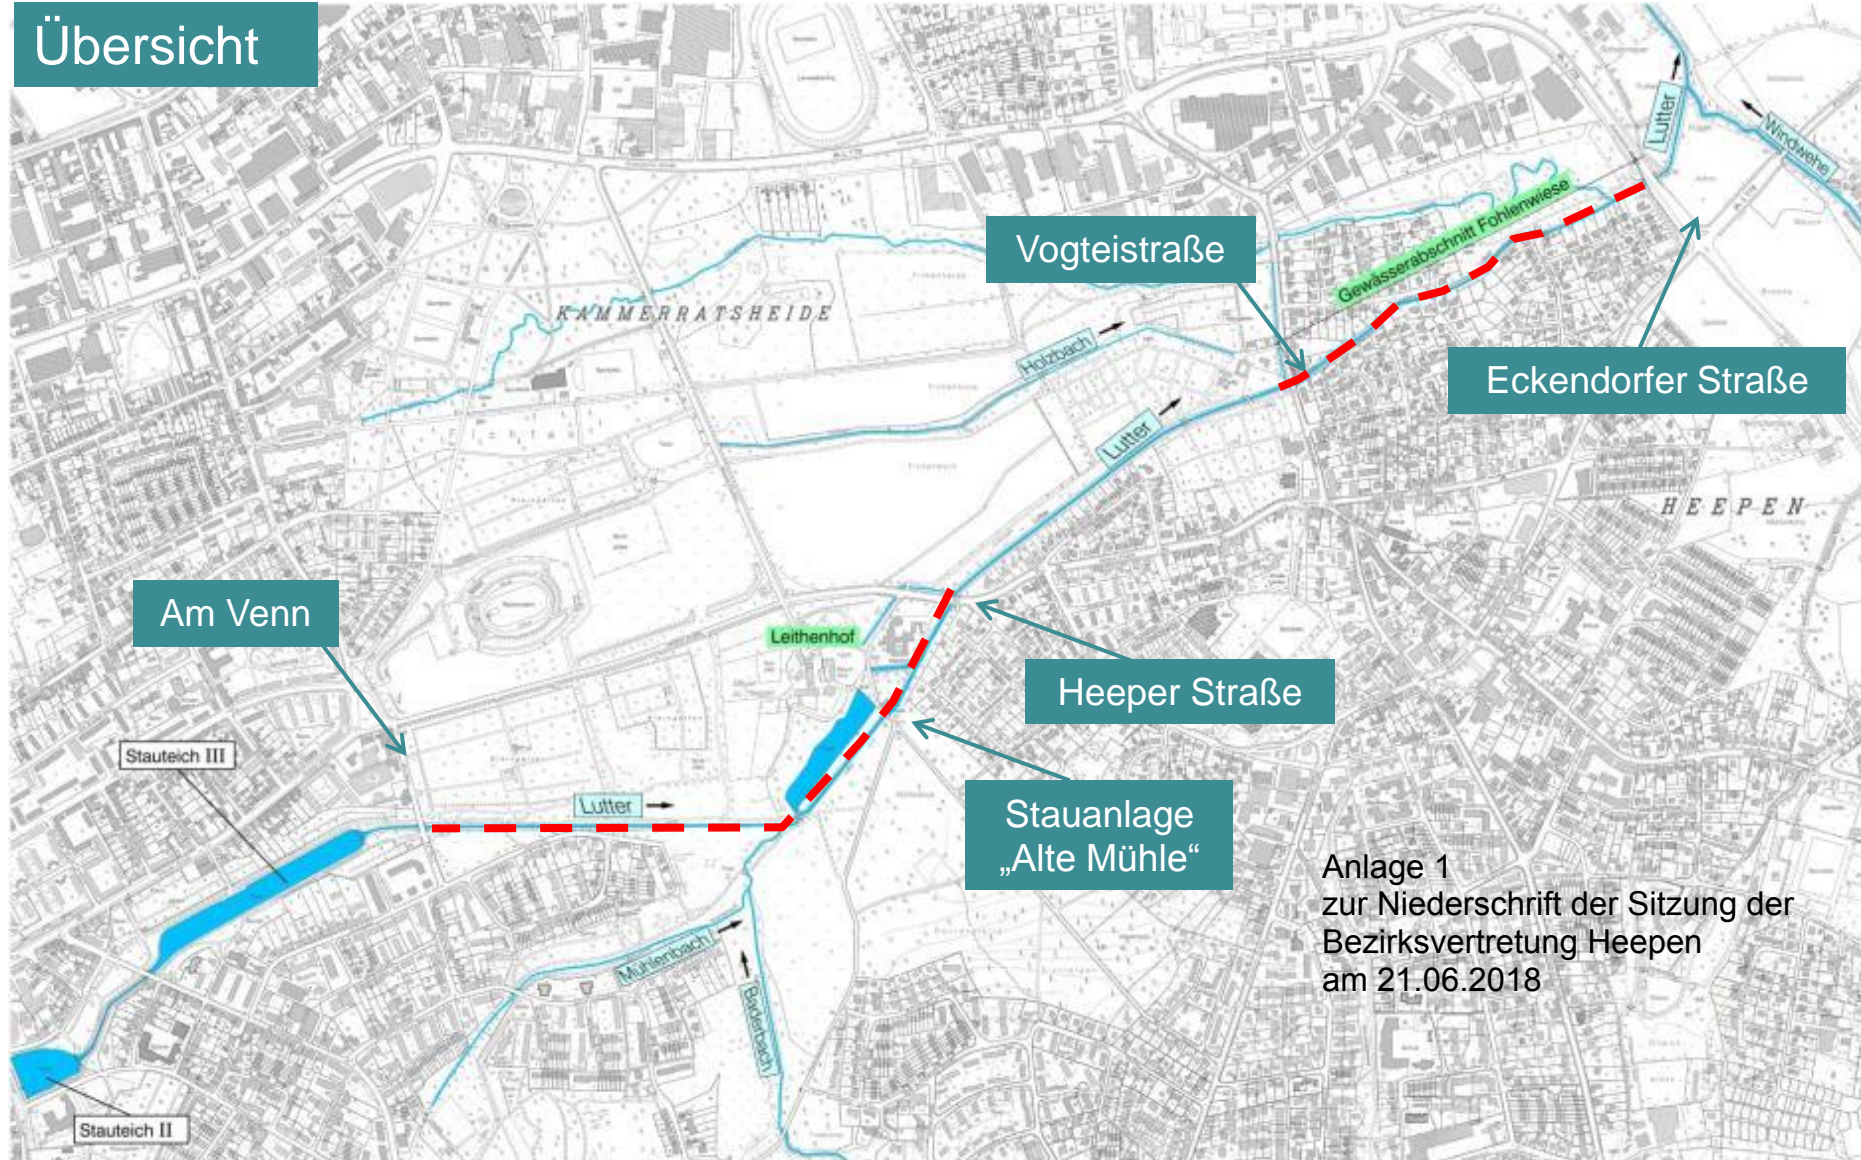


Anlage 1
zur Niederschrift der Sitzung der
Bezirksvertretung Heepen
am 21.06.2018

Naturnaher und hochwassersicherer Ausbau der Lutter in Bielefeld - Heepen

Bezirksvertretung Heepen am 21.06.2018 - Sachstandsbericht


Geplante Maßnahmen

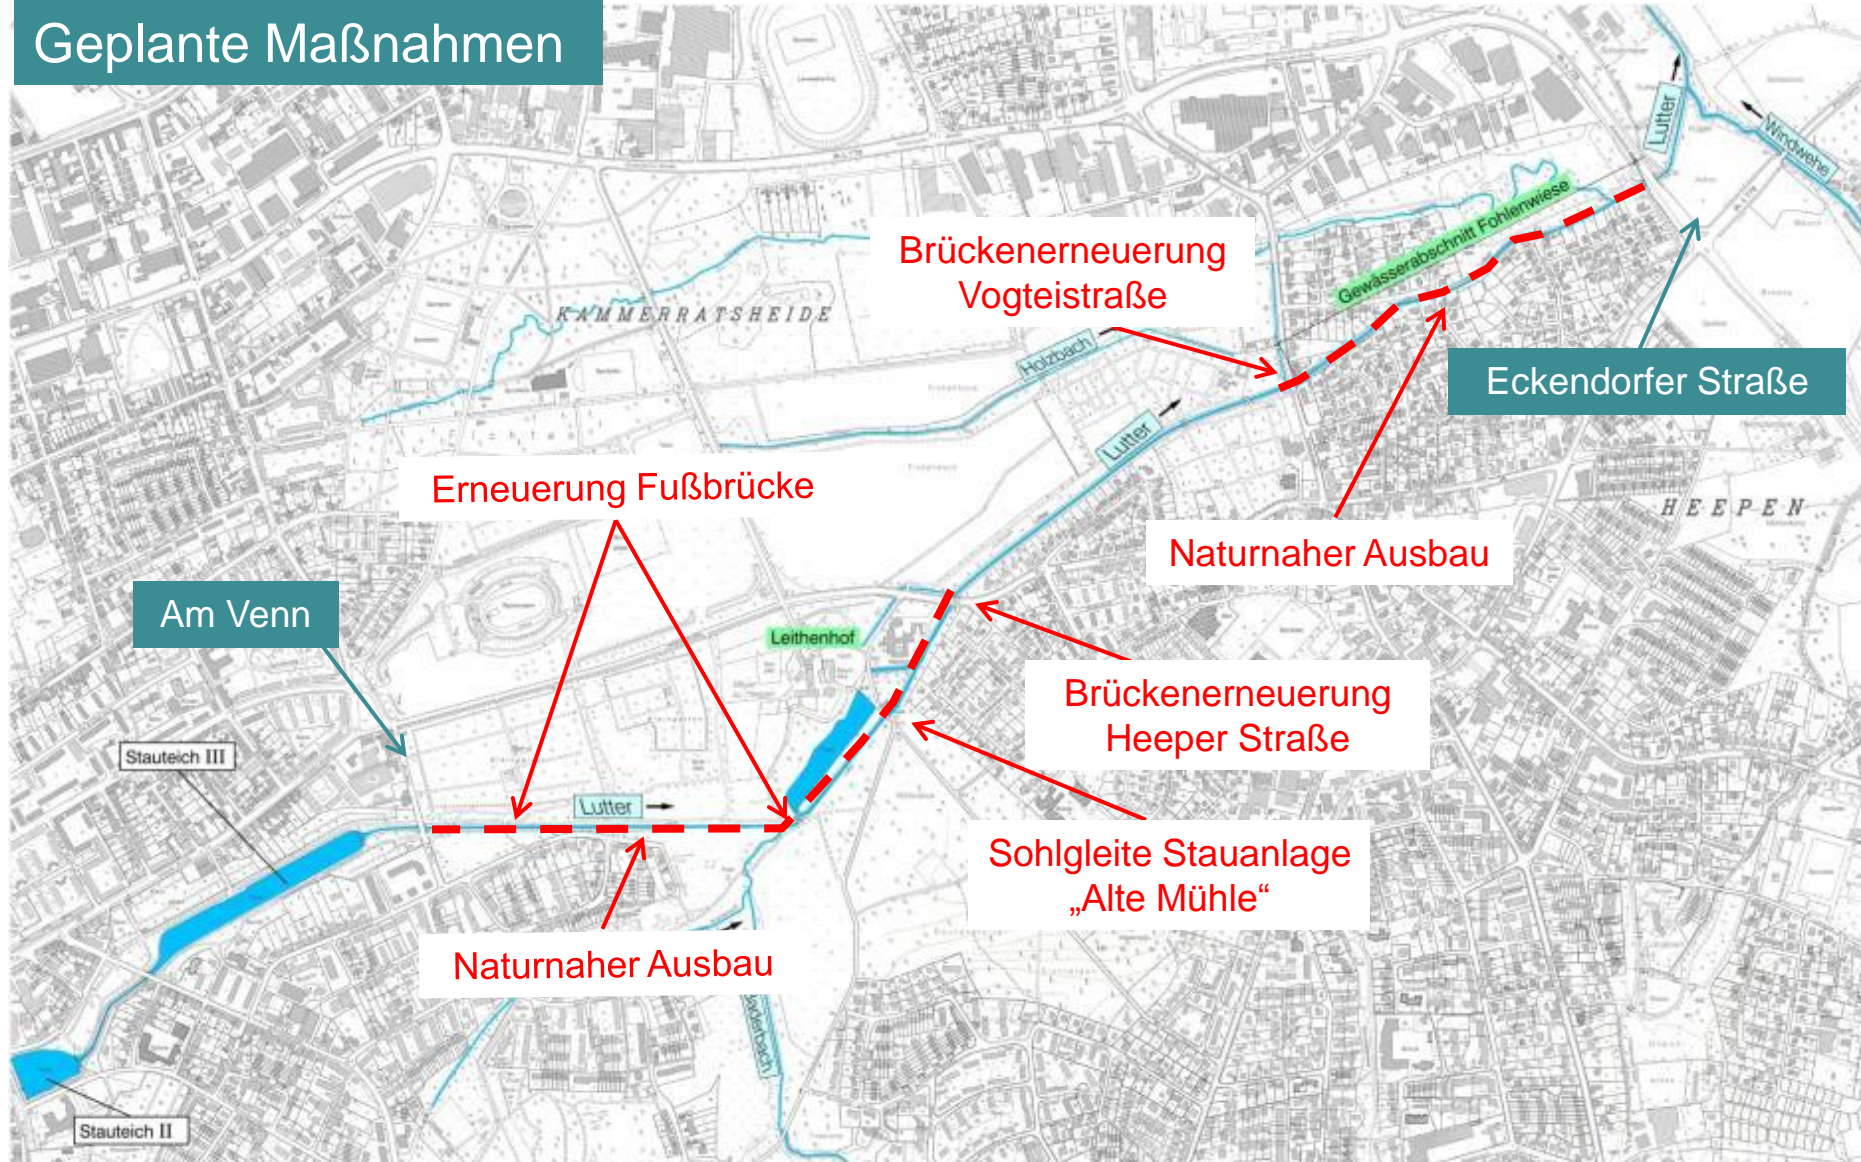

Naturnaher und hochwassersicherer Ausbau der Lutter in Bielefeld - Heepen

Bezirksvertretung Heepen am 21.06.2018 - Sachstandsbericht


Bauabschnitte

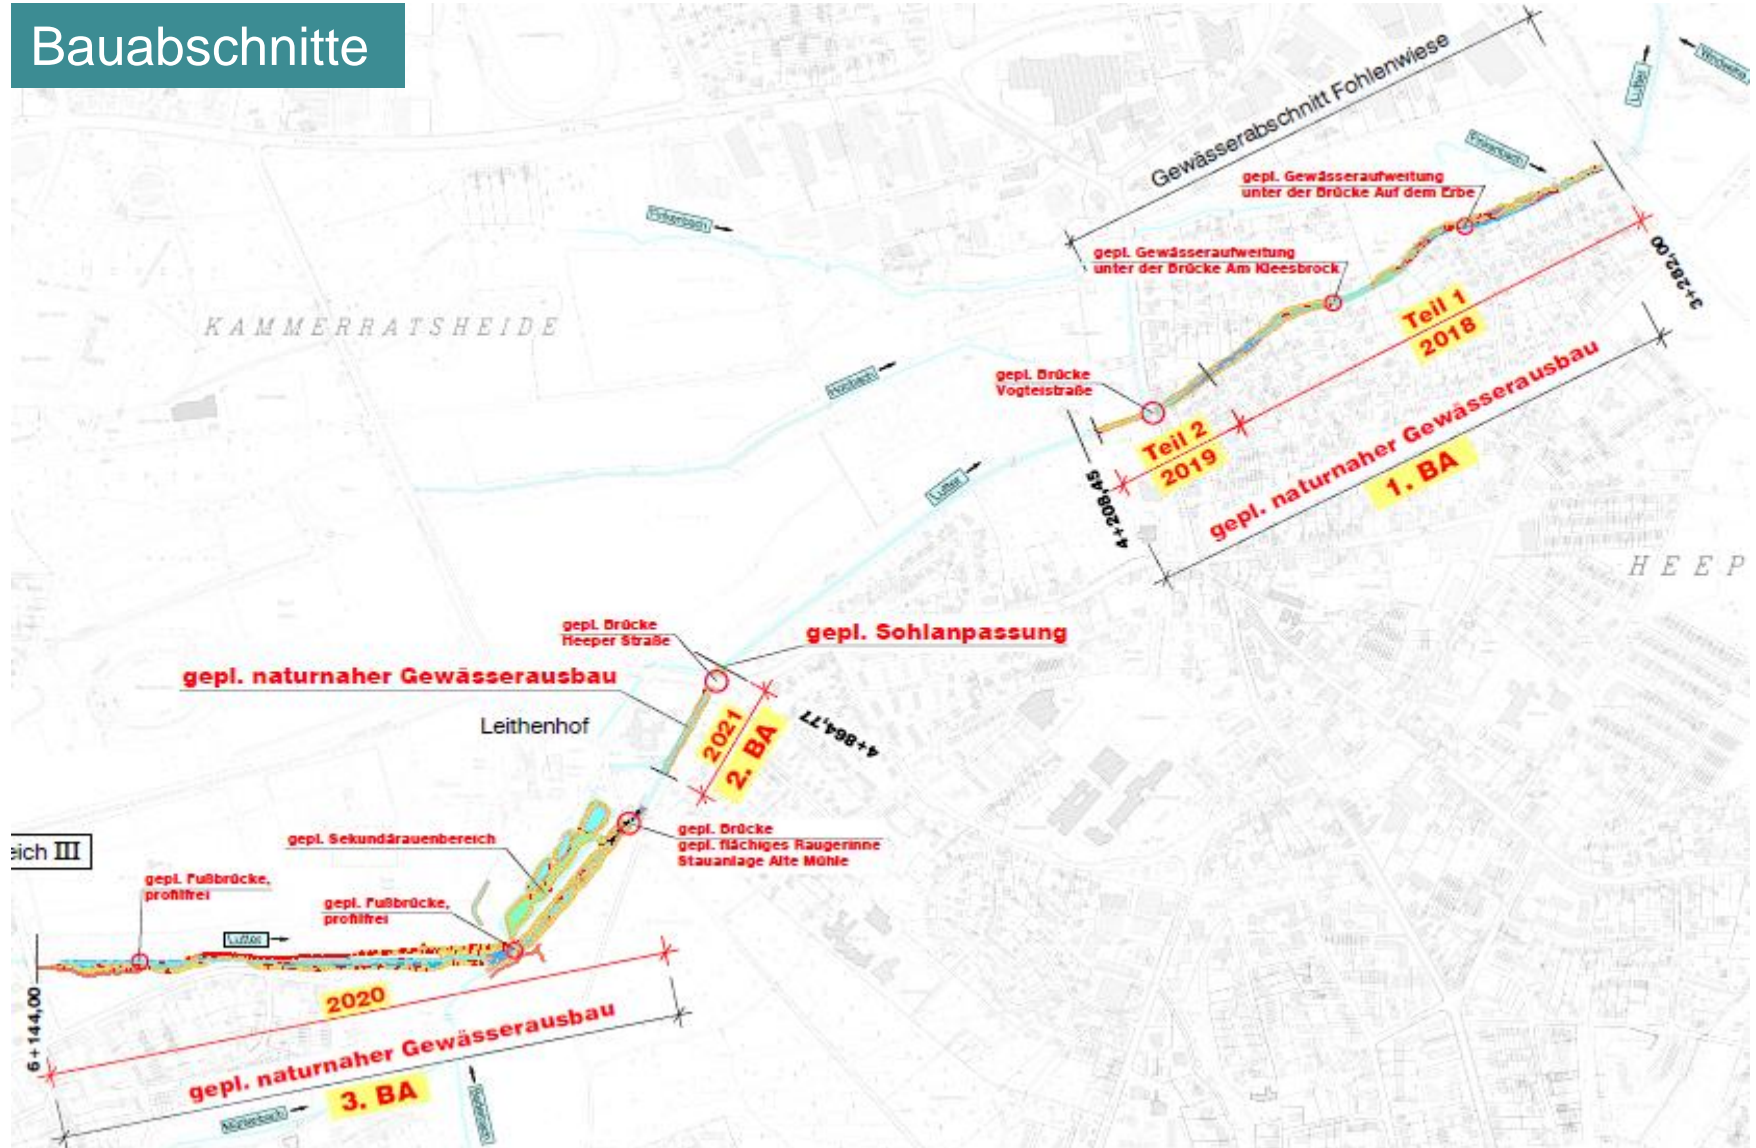

Naturnaher und hochwassersicherer Ausbau der Lutter in Bielefeld - Heepen

Bezirksvertretung Heepen am 21.06.2018 - Sachstandsbericht

Bauabschnitte

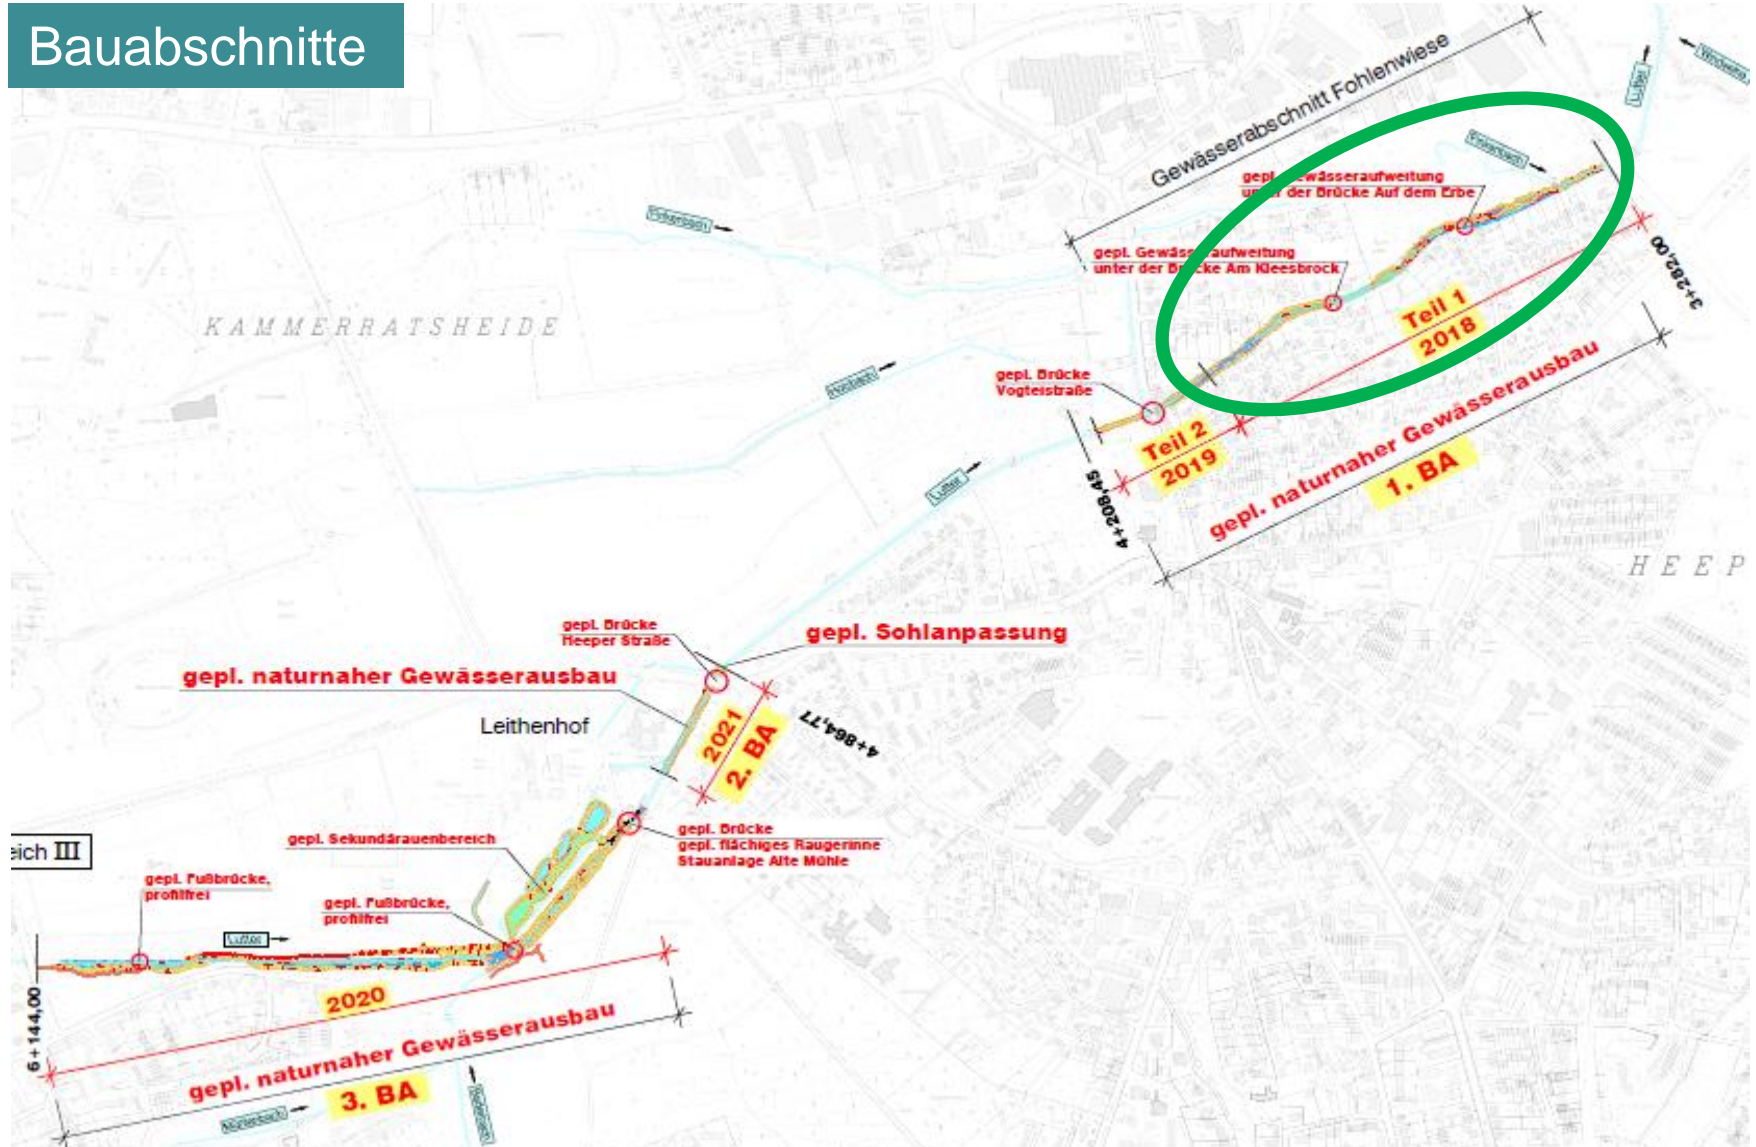


Naturnaher und hochwassersicherer Ausbau der Lutter in Bielefeld - Heepen

Bezirksvertretung Heepen am 21.06.2018 - Sachstandsbericht

Erster Bauabschnitt
Teil 1, 2018

Bodenabtrag und
Böschungsprofilierung


Ufermauer
beidseitig

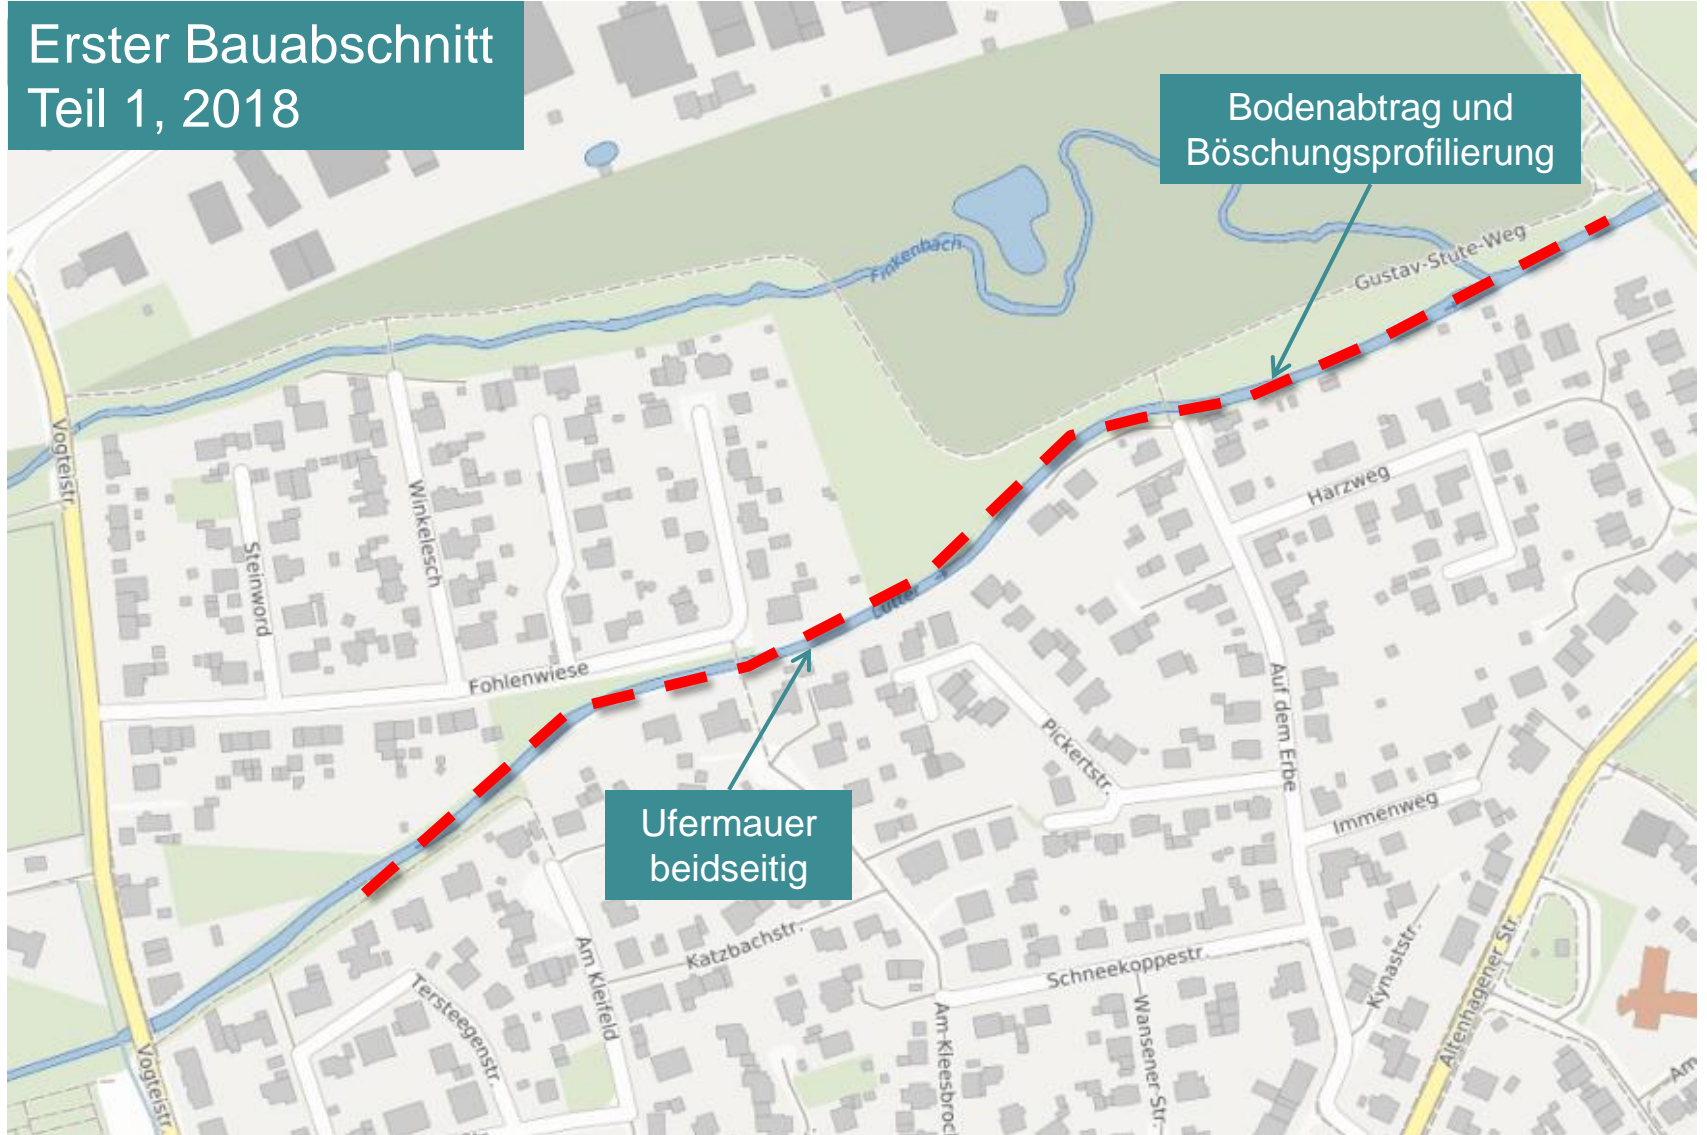

Naturnaher und hochwassersicherer Ausbau der Lutter in Bielefeld - Heepen


Bezirksvertretung Heepen am 21.06.2018 - Sachstandsbericht

Erster Bauabschnitt
Teil 1, 2018

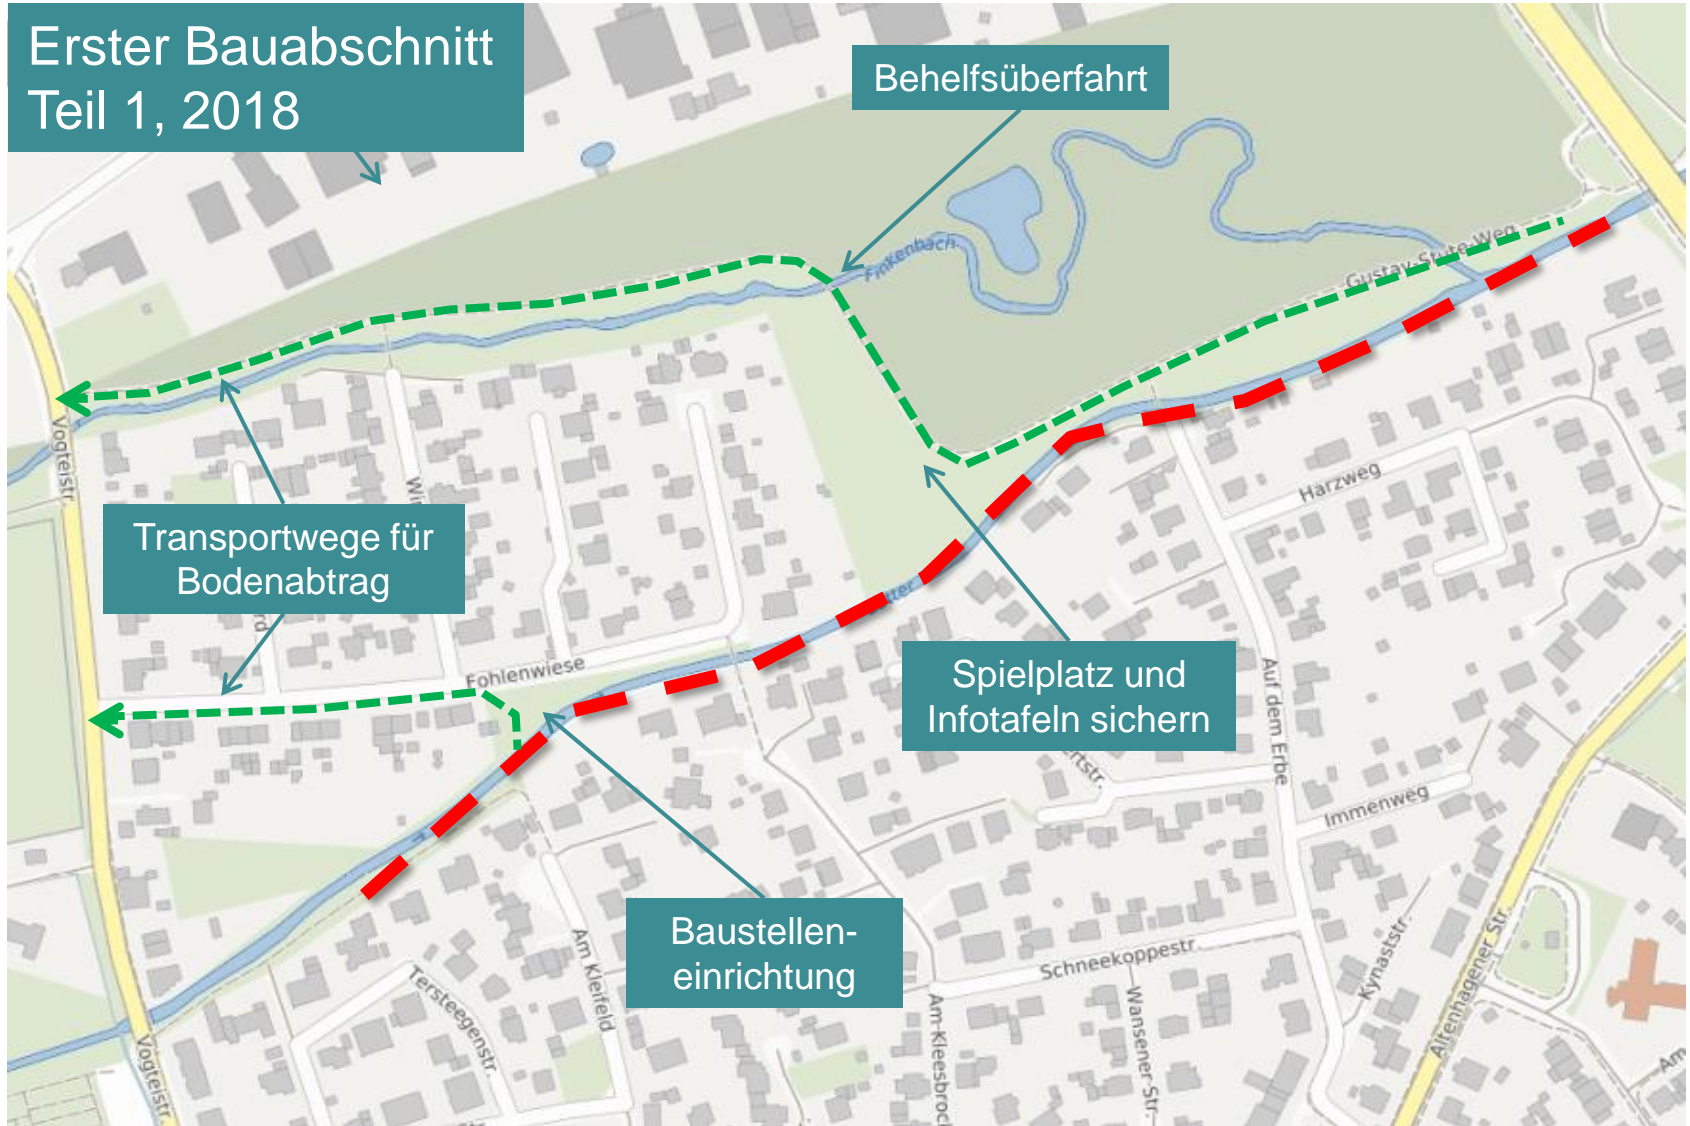

Naturnaher und hochwassersicherer Ausbau der Lutter in Bielefeld - Heepen


Bezirksvertretung Heepen am 21.06.2018 - Sachstandsbericht

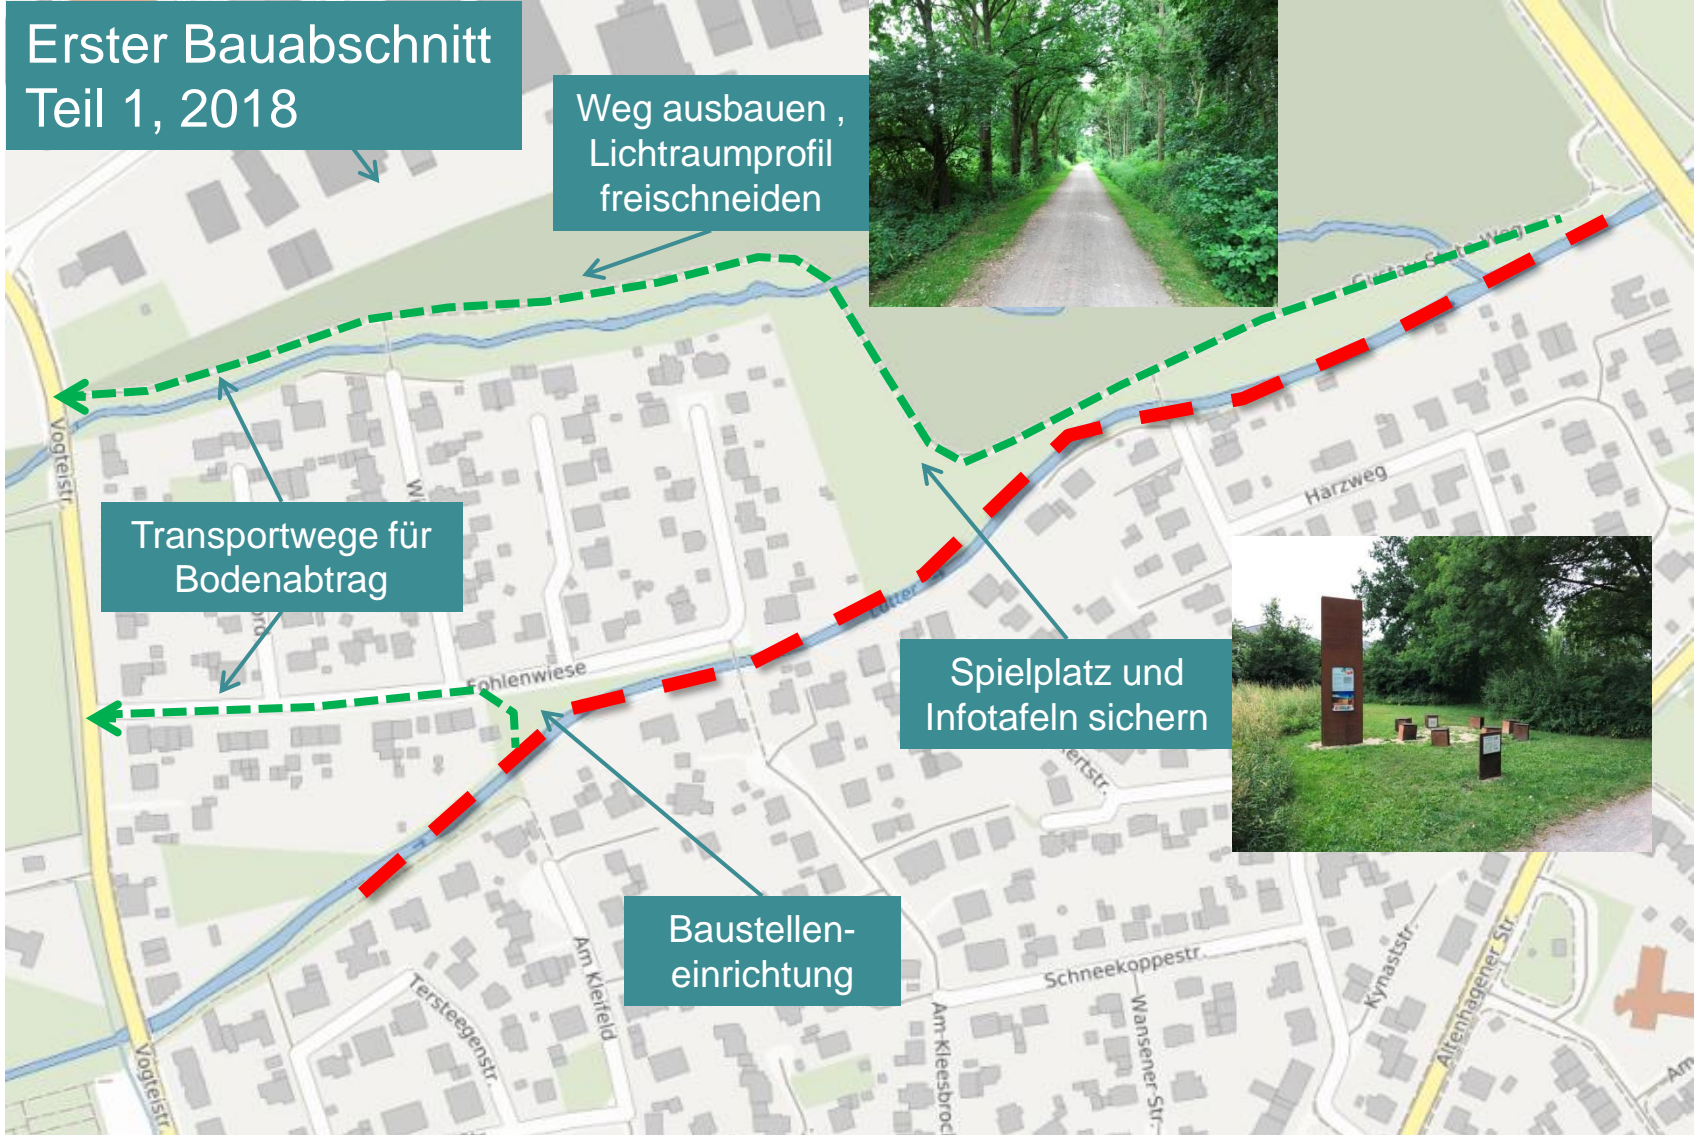

Naturnaher und hochwassersicherer Ausbau der Lutter in Bielefeld - Heepen

Bezirksvertretung Heepen am 21.06.2018 - Sachstandsbericht

Erster Bauabschnitt
Teil 1, 2018, Var. 2

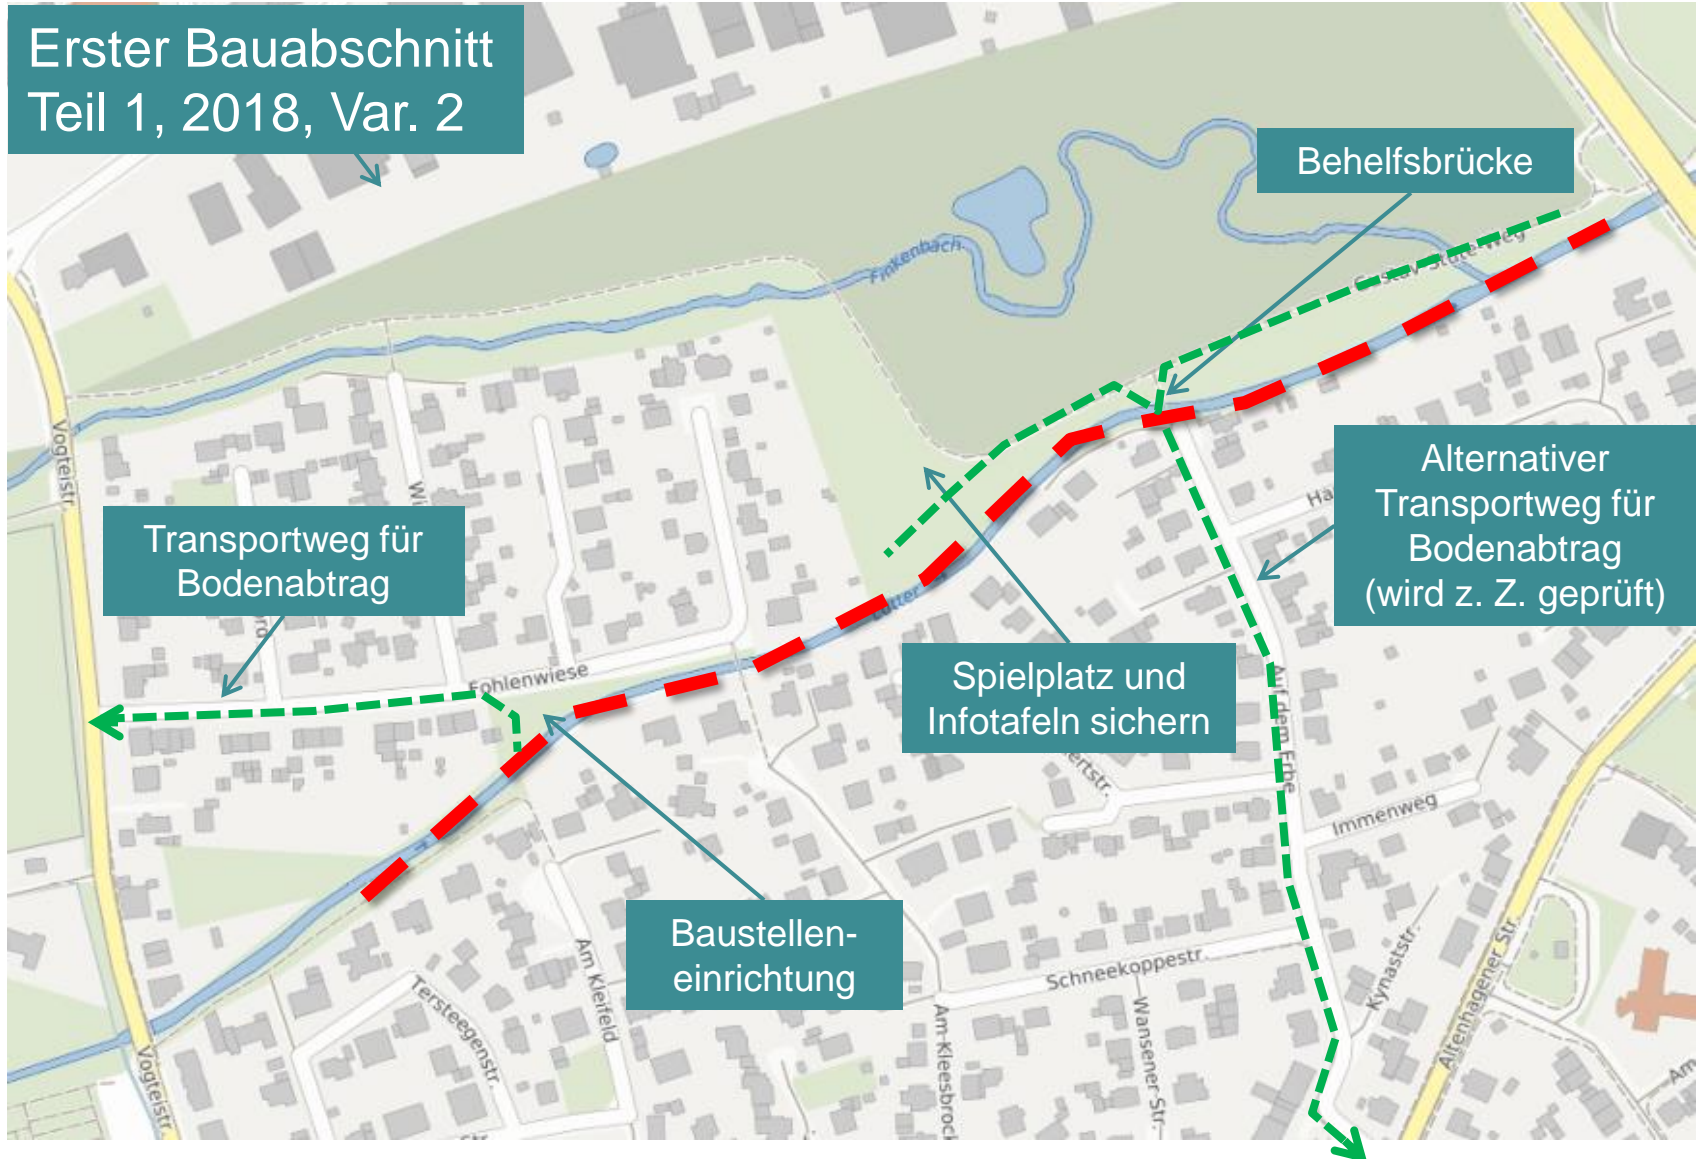

Naturnaher und hochwassersicherer Ausbau der Lutter in Bielefeld - Heepen

Bezirksvertretung Heepen am 21.06.2018 - Sachstandsbericht

Projektstand

- Planfeststellungsbeschluss liegt vor
- Etwa ein Jahr Verzögerung durch Grunderwerbsverhandlungen
(Kaufverträge für den Grunderwerb sind zwischenzeitlich unterzeichnet)
- Baugrundgutachten wurde erstellt
- Ausführungsplanung für den Bauabschnitt 2018 wird bearbeitet
- Geplanter Baubeginn für den ersten Bauabschnitt im Herbst 2018

Naturnaher und hochwassersicherer Ausbau der Lutter in Bielefeld - Heepen

Bezirksvertretung Heepen am 21.06.2018 - Sachstandsbericht

Ausblick

2018

- Erster Bauabschnitt - Teil 1 -
- Gewässerausbau zwischen Eckendorfer Straße und Fohlenwiese



2019

- Erster Bauabschnitt - Teil 2 -
- Erneuerung der Brücke Vogteistraße und Ufermauern



2020

- Zweiter Bauabschnitt
- Gewässerausbau zwischen der Straße Am Venn und Leithenhof
- Umbau der Stauanlage



2021

- Dritter Bauabschnitt
- Erneuerung der Brücke Heeper Straße

Naturnaher und hochwassersicherer Ausbau der Lutter in Bielefeld - Heepen

Bezirksvertretung Heepen am 21.06.2018 - Sachstandsbericht

Einwohnerfragestunde

- Anwohnerfrage eins (aktueller Stand) und zwei (Grund für Verzögerungen) wurden beantwortet
- Verantwortung bei Hochwasserschäden aufgrund von Verzögerungen
 - Bei Gewässerausbaumaßnahmen mit Grunderwerb ist immer mit Verzögerungen zu rechnen. Mit den bereits durchgeführten Sofortmaßnahmen konnte das Hochwasserrisiko bereits deutlich gesenkt werden.
 - Grundsätzlich haftet weder das Land noch die Gemeinden für Überschwemmungsschäden.
 - Bewohner überschwemmungsgefährdeter Gebiete haben sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten selbst vor den Folgen und Auswirkungen eines Hochwassers zu schützen (§ 5 Abs. 2 WHG).
