

Amt für Verkehr, 28.04.2021, 8417
660.14

Antwort auf die Anfrage der SPD und DIE LINKE zum Glasfaserausbau Ubbedissen und Auf dem Busch für die Sitzung der Bezirksvertretung Stieghorst am 06.05.2021

Fragen:

Wie sieht der aktuelle Zeitplan für den Glasfaserausbau in Ubbedissen aus?

Bis wann wird der Ausbau abgeschlossen sein?

Zusatzfrage: Liegen bereits jetzt Erkenntnisse vor, die den geplanten Ausbau im Ausbaubereich „Auf dem Busch“, ggf. pandemiebedingt, verzögern werden?

Antwort:

Die Stadtwerke Bielefeld und BITel teilen mit, dass die Bauarbeiten zum Breitbandausbau in Ubbedissen wegen des Extremwetters in diesem Winter leicht verzögert sind. Die Zusagen für die Kunden werden jedoch eingehalten.

Im Verlauf des Jahres 2021 werden das Ausbaubereich Ubbedissen (inklusive des Gewerbegebietes Gustav-Winkler-Straße) und die Ergänzung „Auf dem Busch“ fertig erschlossen und ab Oktober 2021 werden die Kunden aktiv geschaltet (s. Karten unten). Bis auf wenige Sonderfälle sollten die Kunden zum Ende 2021 aktiv geschaltet sein.

Für „Auf dem Busch“ wird Baubeginn im Mai 2021 sein.

Der zeitintensive Tiefbau schreitet gut voran. Im Basisgebiet in Ubbedissen ist der Tiefbau für die Hauptstrecken abgeschlossen und 69% der Hausanschlüsse sind baulich ausgeführt. Das Einziehen von Mikroerohren für Breitband und das Einblasen und Verbinden der Glasfasern steht noch aus.

Abb. 1: Ausbaubereich Ubbedissen

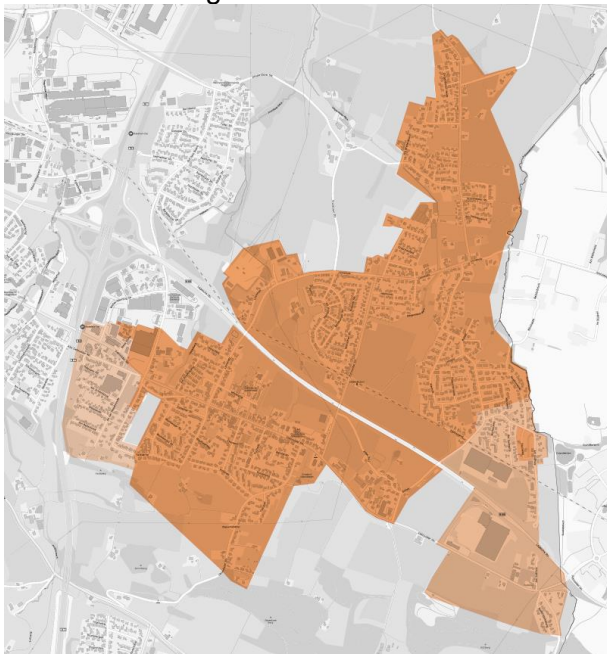


Abb. 2: Ausbaubereich Auf dem Busch



gez.
Opitz
