




Bielefeld

30.06.2026

**Errichtung einer Förderschule -
Stand der Arbeiten am Standort der
Marktschule in Brackwede (Interim)**

Stadt Bielefeld
Immobilienervicebetrieb

Förderschule TWS Interim

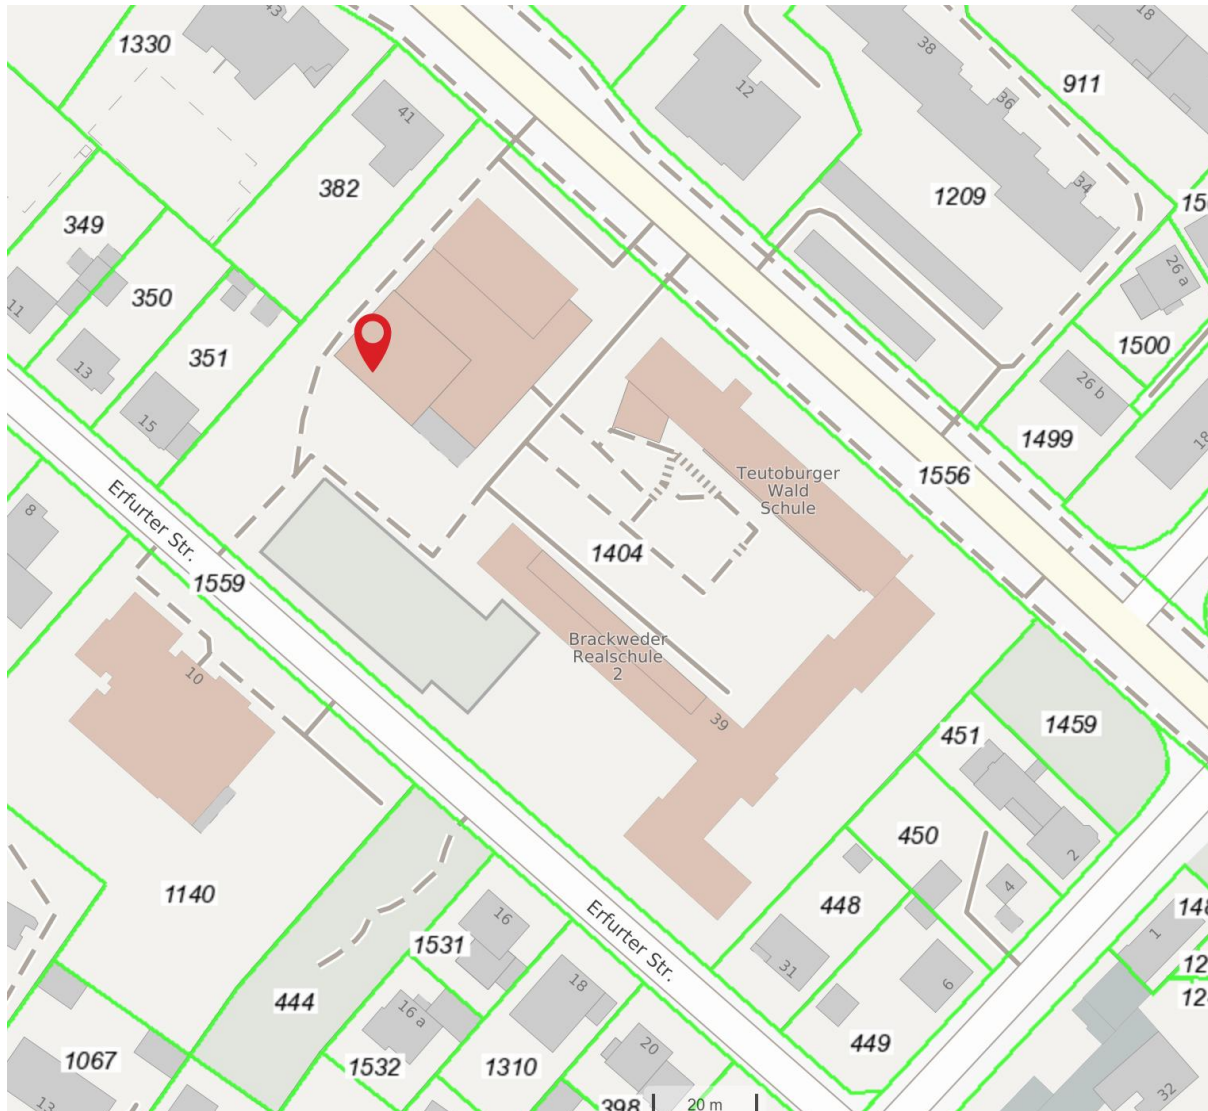


Übersicht

Teutoburger
Wald Schule

Realschule
Brackwede 2

Sporthalle und
Lehrschwimm-
becken

Förderschule TWS Interim

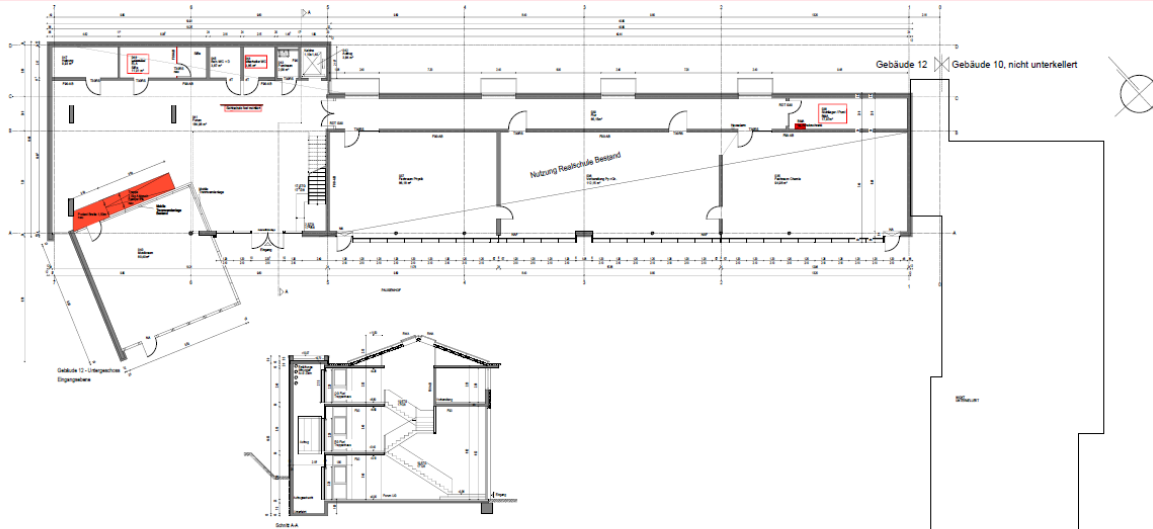

Untergeschoss


Zugang für SuS der
Förderschule „Teutoburger
Wald Schule“

Musikraum mit barrierefreier
Erschließung

WC für Mitarbeitende

Räume für Technik, SiBel,
und BMA

Übrige Räume RS Brackwede

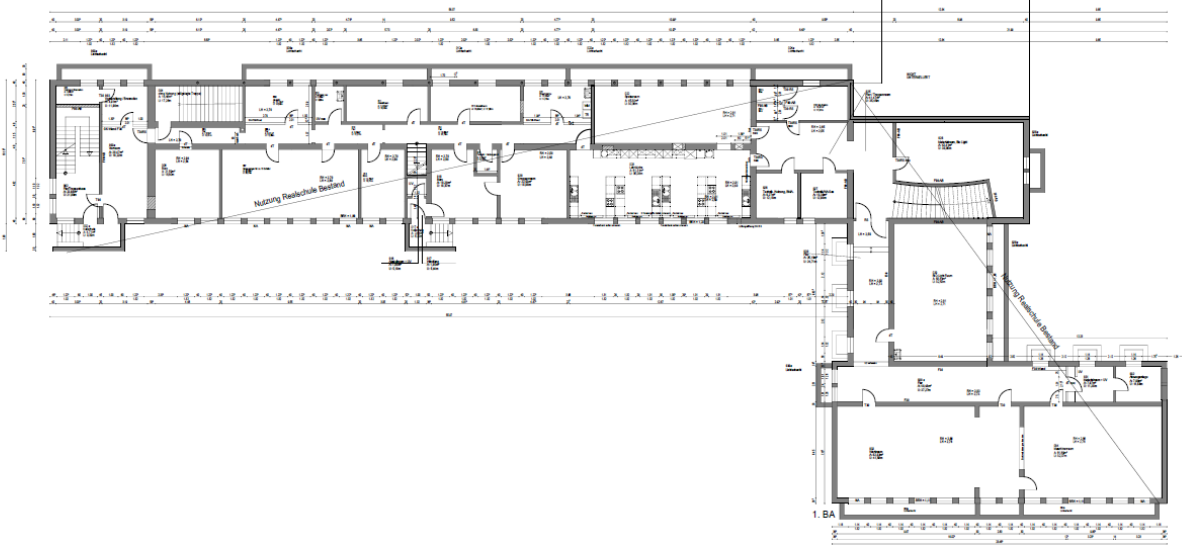

Förderschule TWS Interim



Erdgeschoss

Einbau Pflegebereich mit Beh.
WC, Pflege und zwei
zusätzlichen WC-Kabinen

Klassenräume, Diff-Räume,
Fach- und Bewegungsräume,
Garderoben

Klassen mit Spüle und
Kühlschrank


Einbau einer Verteilküche

Treppenlift

Verwaltungsräume

Übrige Räume RS Brackwede

Förderschule TWS Interim

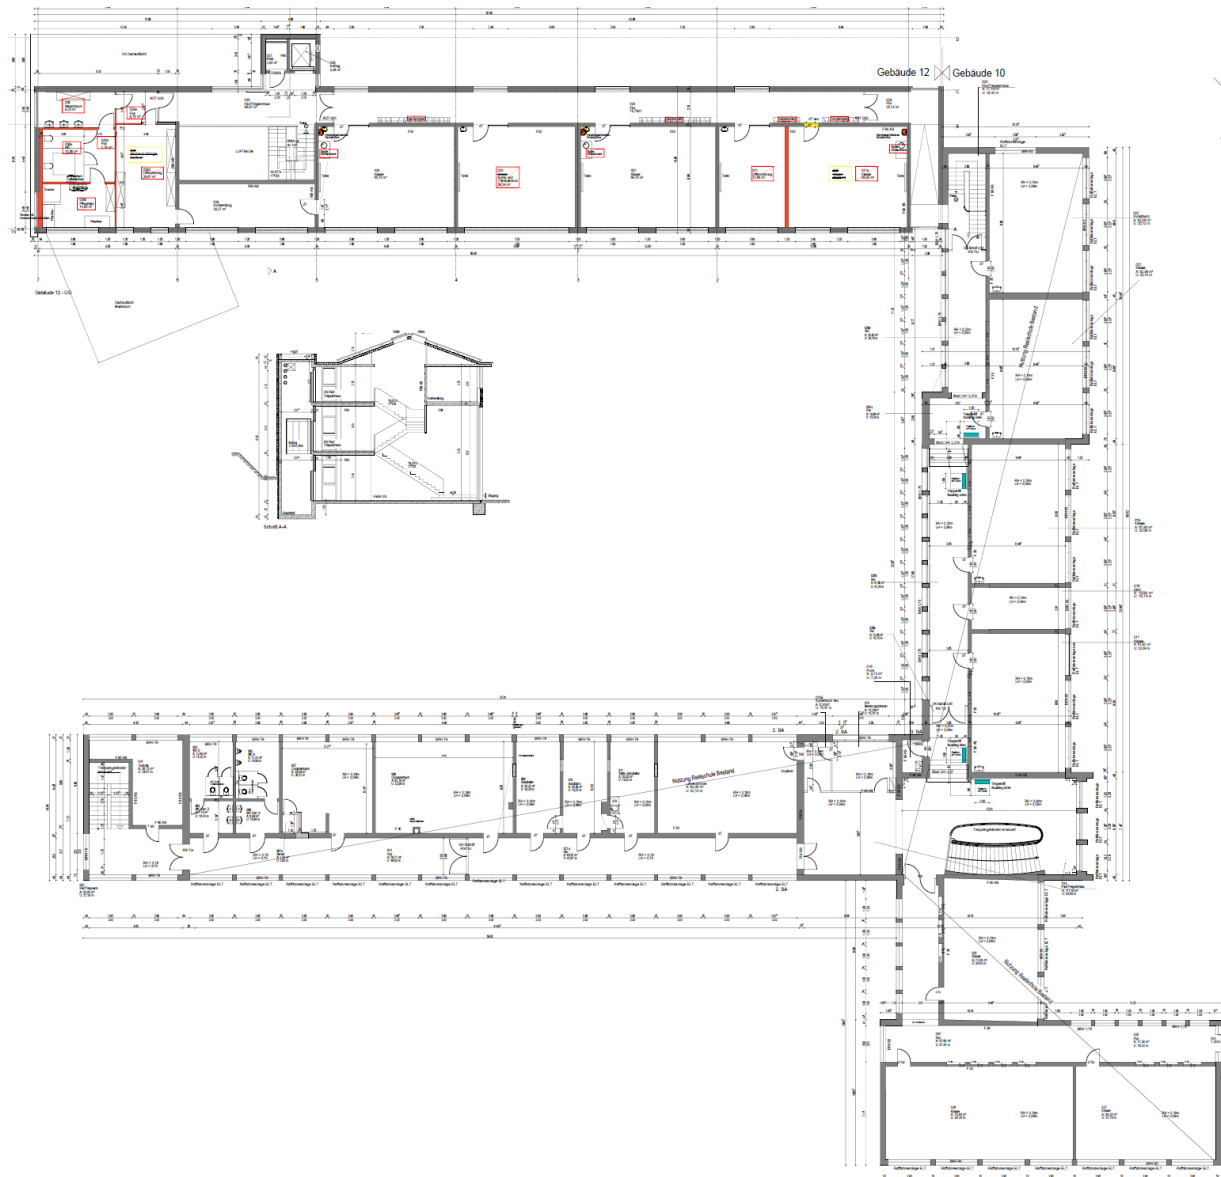

1. Obergeschoss

Einbau Pflegebereich mit Beh.
WC, Pflege und zwei
zusätzlichen WC-Kabinen

Klassenräume, Diff-Räume,
Fach- und Bewegungsräume,
Garderoben, Therapieraum

Klassen mit Spüle und
Kühlschrank

Übrige Räume RS Brackwede

Förderschule TWS Interim

TERMINPLAN

16./17.KW	Demontage Elektro
20.KW	Abbrucharbeiten Kernbohrungen
21.-23.KW	Trockenbau/Räume herstellen
23./24.KW	Sanitär, neue WC/Pflegebadbereiche
25-28.KW	Elektro BMA/SIBE Anpassung Kabelnetz
26/27.KW	Sanitär, Pantry Klassenräume/Küche
25./26.KW	Trockenbau, WC/Pflegebereiche Wände/Decken schließen
27./28. KW	Bodenbeläge Klassenräume
26./28.KW	Fliesenarbeiten WC/Pflegebereiche
28.KW	Trockenbau Wände/Decken schließen
29.KW	Bodenbelag WC/Pflegebad
29-31.KW	Malerarbeiten
30.-31.KW	Fertiginstallationen HLS/E Küche
32./33.KW	Einbaumöbel Bauschlussreinigung Abnahmen

**Bauzeitenplan
wöchentlich**

Aktuelle Baustellenfotos



Aktuelle Baustellenfotos



Aktuelle Baustellenfotos

