

BITel: Planung KVz-/ Glasfaserausbau

BITel

Stadt	Ortsteil/ Bereich	Anschlussbereiche	Ausbauart	Planung	Voraussichtlicher Anschlusstermin	Bau- vorbereitungen	Tiefbau- maßnahmen	Aufbau MFG-Schrank	Anschlussarbeiten Deutsche Telekom	Technische Systemeinrichtung und Qualitätsprüfung	Inbetriebnahme
Bielefeld	Babenhausen	ASB 10	KVz-Ausbau	erledigt	2014	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	aktiv
	Hillegossen (Auf dem Busch)	ASB 20	KVz-Ausbau	geplant	2016	geplant	geplant	geplant	geplant	geplant	geplant
	Lärershagen	ASB 1	KVz-Ausbau	geplant	2016	geplant	geplant	geplant	geplant	geplant	geplant
	Ubbedissen 1	ASB 8	KVz-Ausbau	erledigt	2013	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	aktiv
	Ubbedissen 2	ASB 8	KVz-Ausbau	erledigt	2014	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	aktiv
	Ubbedissen 3	ASB 8	KVz-Ausbau	geplant	2016	geplant	geplant	geplant	geplant	geplant	geplant
Gütersloh	Blankenhagen	ASB 3	KVz-Ausbau	erledigt	2014	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	aktiv
	Friedrichsdorf	ASB 1	KVz-Ausbau	erledigt	2015	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	aktiv
	Isselhorst (Krullsbachau)	ASB 6	Glasfaserausbau	geplant	2016	geplant	geplant	geplant	geplant	geplant	geplant
	Niederst	ASB 3	KVz-Ausbau	erledigt	2012	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	aktiv
	Pavenstädt (Auf dem Stempel)		Glasfaserausbau	geplant	2016	geplant	geplant	geplant	geplant	geplant	geplant
	Pavenstädt (Fritz-Blank-Straße)		Glasfaserausbau	erledigt	Dezember 15	begonnen	begonnen	geplant	geplant	geplant	geplant
Werther	Theenhausen	ASB 1	KVz-Ausbau	erledigt	Dezember 15	begonnen	begonnen	September	geplant	geplant	geplant

Stand: 14.10.2015



33502 Bielefeld Nordrhein-Westfalen

Straße und Hausnummer

Suchen

Aktuelle Position mit Richtung zum nächsten Mobilfunksender

Mobilfunknetz

Festnetz

- ☒ DSL 16 bis zu 16 Mbit/s
- ☒ Hybrid
- ☐ VDSL 50 bis zu 50 Mbit/s
- ☐ VDSL 100 bis zu 100 Mbit/s
- ☐ Glasfaser bis zu 200 Mbit/s
- ☐ VDSL Ausbau geplant bis zu 50 Mbit/s
- ☐ VDSL Ausbau geplant bis zu 100 Mbit/s

HOTSPOT / WLAN TO GO


Mobile Data Zuhause / T-Mobile@home


Drucken

Oben

2km

Sources: Esri, HERE, DeLorme, USGS, Intermap, mitchell

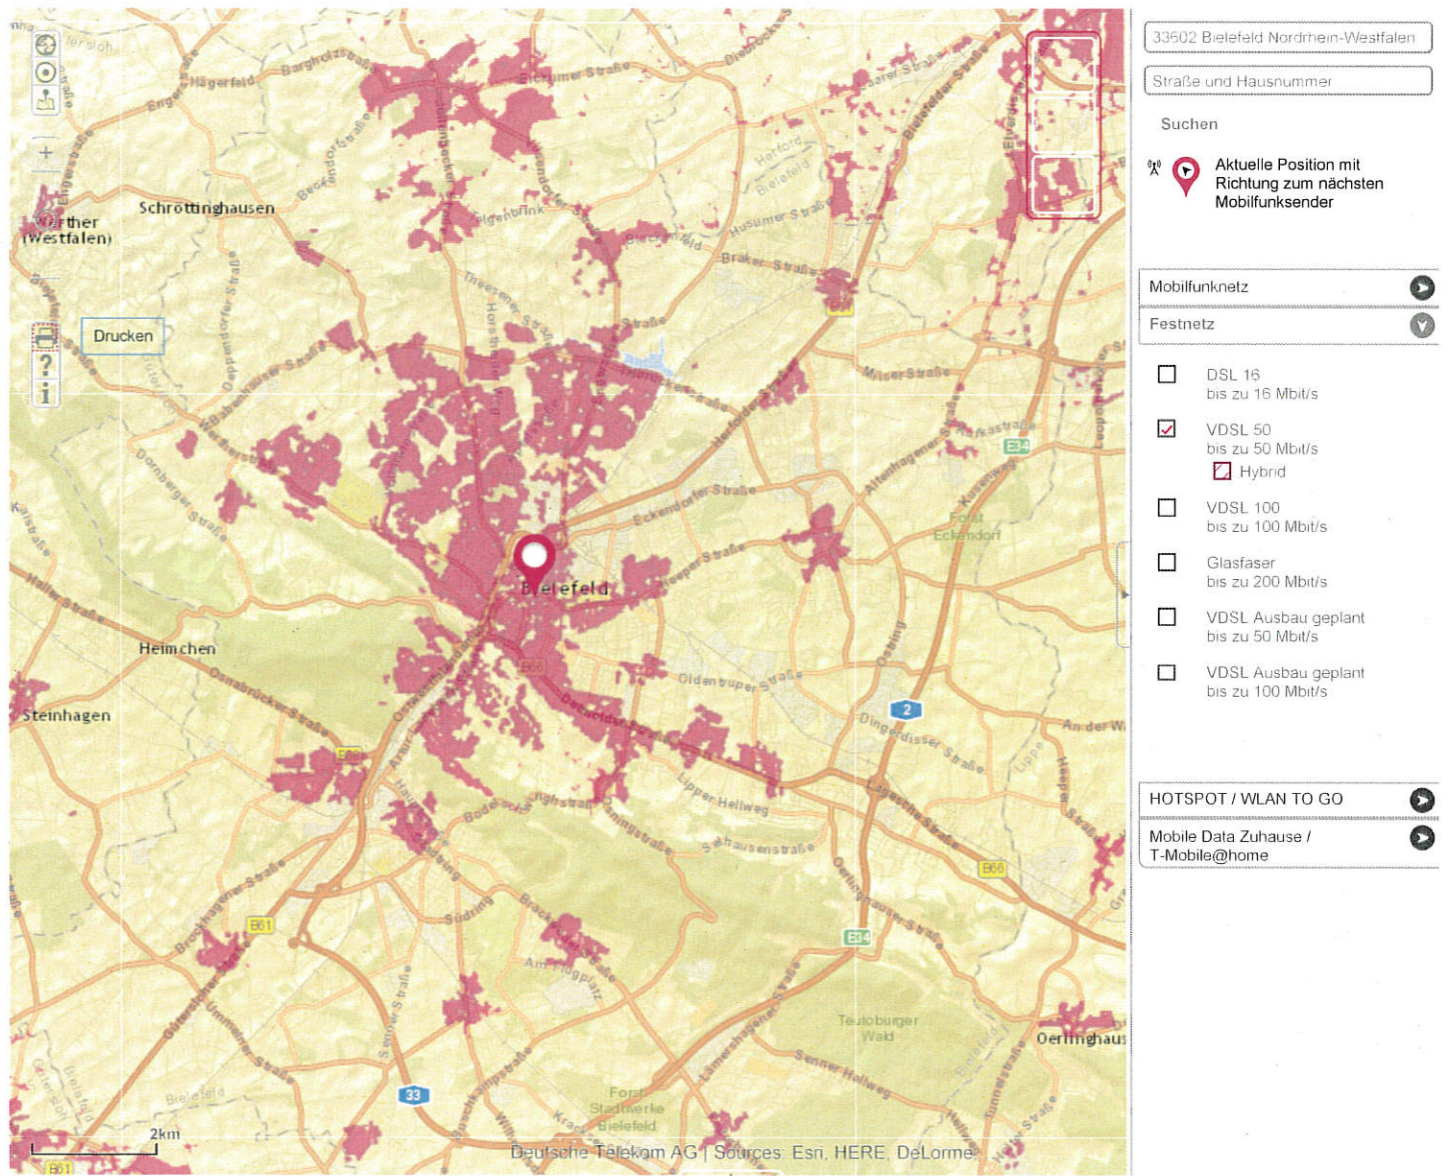

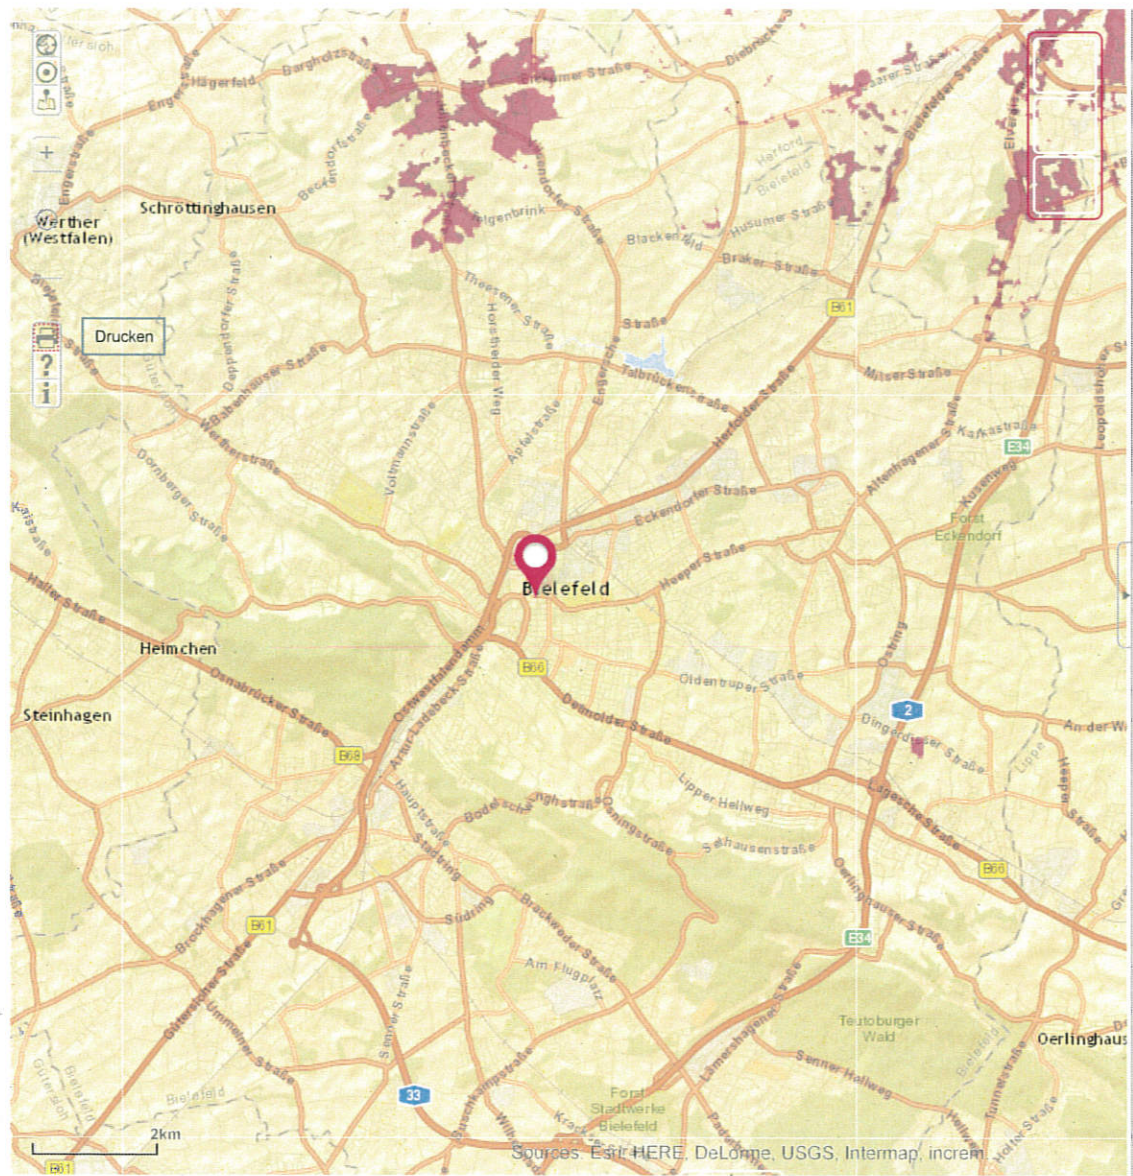

33502 Bielefeld Nordrhein-Westfalen

Straße und Hausnummer

Suchen

Aktuelle Position mit Richtung zum nächsten Mobilfunksender

Mobilfunknetz


Festnetz

- ☐ DSL 16 bis zu 16 Mbit/s
- ☐ VDSL 50 bis zu 50 Mbit/s
- ☒ VDSL 100 bis zu 100 Mbit/s
 - ☒ Hybrid
- ☐ Glasfaser bis zu 200 Mbit/s
- ☐ VDSL Ausbau geplant bis zu 50 Mbit/s
- ☐ VDSL Ausbau geplant bis zu 100 Mbit/s

HOTSPOT / WLAN TO GO

Mobile Data Zuhause / T-Mobile@home

Sources: Esri, HERE, DeLorme, USGS, Intermap, increment

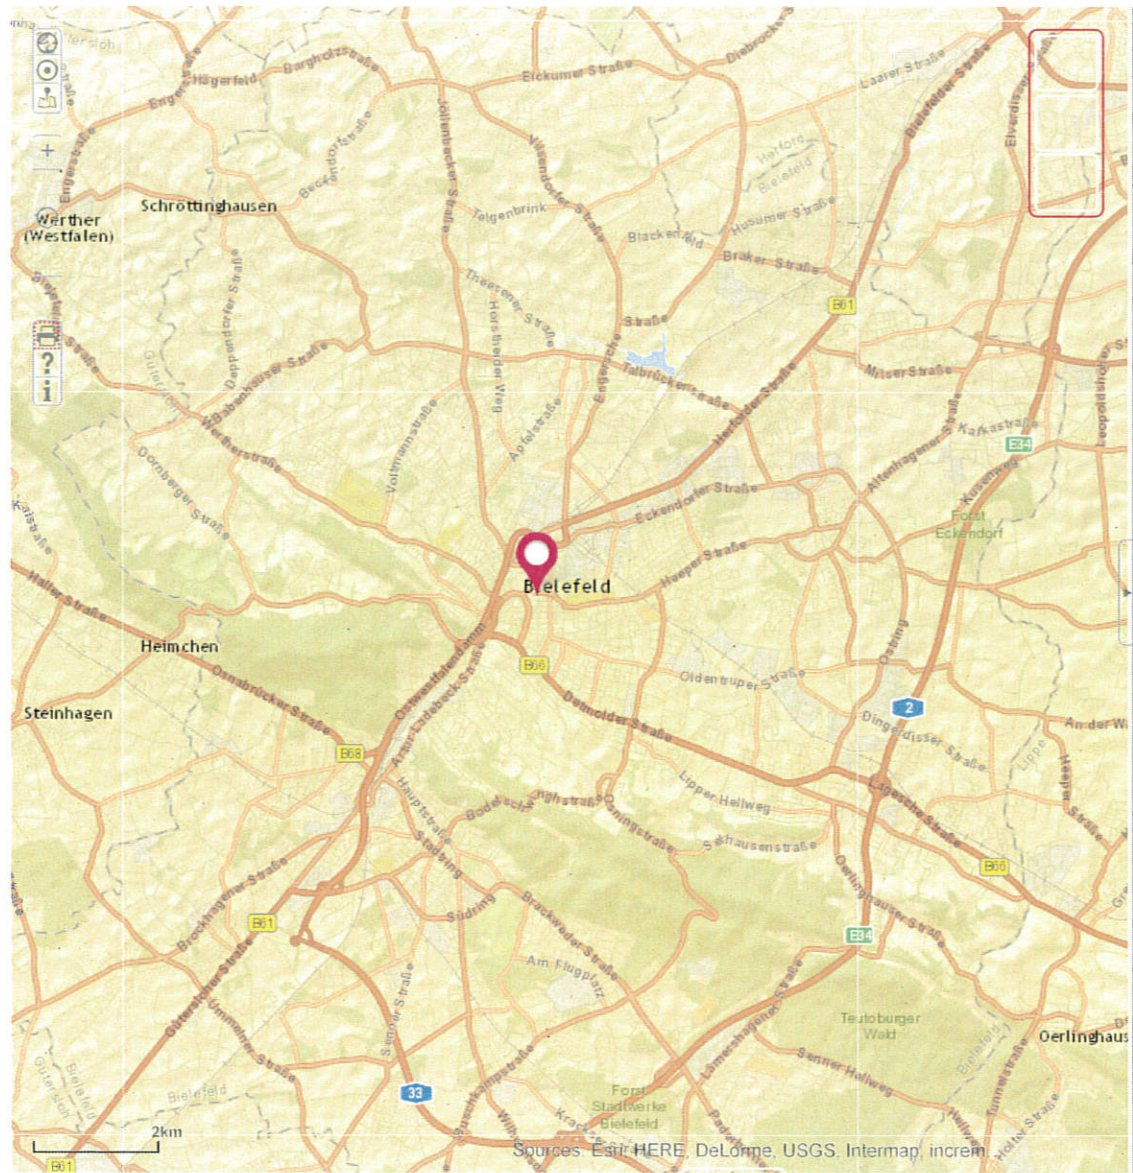

33602 Bielefeld Nordrhein-Westfalen

Straße und Hausnummer

Suchen

Aktuelle Position mit Richtung zum nächsten Mobilfunksender

Mobilfunknetz


Festnetz

- ☐ DSL 16 bis zu 16 Mbit/s
- ☐ VDSL 50 bis zu 50 Mbit/s
- ☐ VDSL 100 bis zu 100 Mbit/s
- ☒ Glasfaser bis zu 200 Mbit/s
- ☐ VDSL Ausbau geplant bis zu 50 Mbit/s
- ☐ VDSL Ausbau geplant bis zu 100 Mbit/s

HOTSPOT / WLAN TO GO

Mobile Data Zuhause / T-Mobile@home

Sources: Esri, HERE, DeLorme, USGS, Intermap, increment

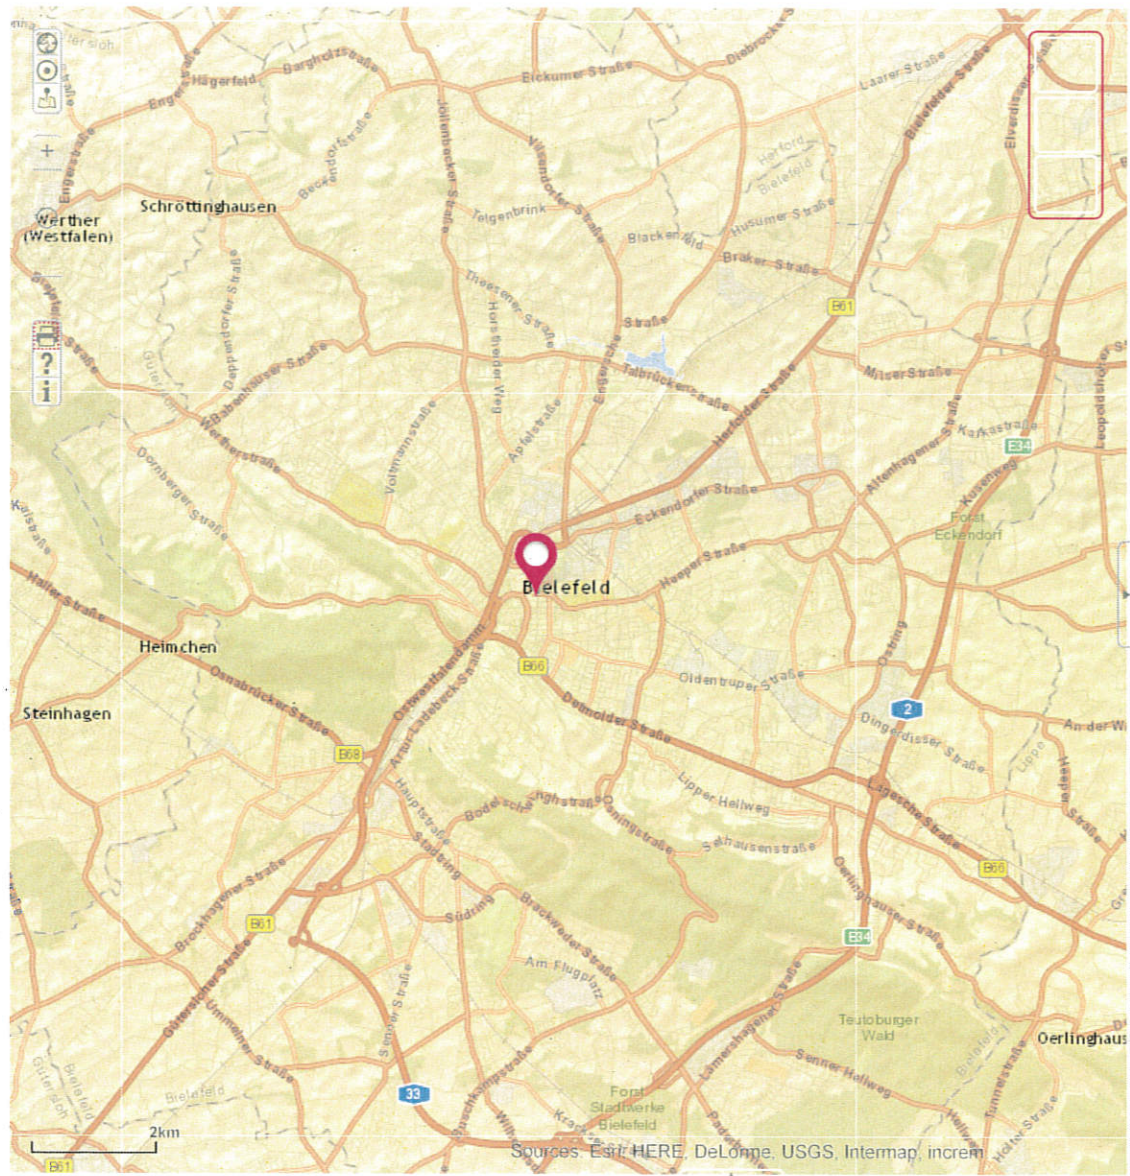

33502 Bielefeld Nordrhein-Westfalen

Straße und Hausnummer

Suchen

Aktuelle Position mit Richtung zum nächsten Mobilfunksender

Mobilfunknetz

Festnetz

- ☐ DSL 16 bis zu 16 Mbit/s
- ☐ VDSL 50 bis zu 50 Mbit/s
- ☐ VDSL 100 bis zu 100 Mbit/s
- ☐ Glasfaser bis zu 200 Mbit/s
- ☒ VDSL Ausbau geplant bis zu 50 Mbit/s
- ☐ VDSL Ausbau geplant bis zu 100 Mbit/s

HOTSPOT / WLAN TO GO

Mobile Data Zuhause / T-Mobile@home

Sources: Esri, HERE, DeLorme, USGS, Intermap, increment

