

Amt für Verkehr 660.32, 14.11.2017, 2801

### **Straßenbauarbeiten August-Bebel-Straße zwischen Brandenburger Straße und Van-Randenborgh-Weg**

Das Amt für Verkehr teilt unter Bezugnahme auf die Anregung des Vorsitzenden des Stadtentwicklungsausschusses am 17.10.2017 zu TOP 33.1 (Drucksache 5464/2014-2020) mit:

Ziel der Baumaßnahme war die Erhöhung der Verkehrssicherheit speziell für Radfahrer. Als Ergebnis der Unfallkommission sollte eine Radfahrschleuse stadteinwärts vor der Kreuzung August-Bebel-Straße / Paulusstraße gebaut werden. Die Baumaßnahme begann im Sommer 2016. Die Radfahrschleuse wurde hergestellt, die Asphaltdecke wurde dabei zunächst nur bis zur Hälfte der Kreuzung Paulusstraße mit einer lärmoptimierten Asphaltdecke versehen und die neue Radfahrerführung mittels neuer Fahrbahnmarkierung auch in 2016 hergestellt.

Aufgrund geplanter Leitungsarbeiten der Stadtwerke, die von der Werner-Bock-Straße bis in den Kreuzungsbereich August-Bebel-Straße/Paulusstraße mit hineinreichten, wurden die Vertragsarbeiten unterbrochen. Der Bereich ab der Kreuzung Paulusstraße bis zum Van-Randenborgh-Weg wurde zurückgestellt. So ließen sich Aufbrüche in einer neuen Fahrbahndecke vermeiden.

Die Stadtwerke ließen die Leitungsarbeiten im Sommer 2017 ausführen. Die Verlegung erfolgte in der Asphaltfahrbahn auf dem Abschnitt Paulusstraße bis zur Werner-Bock-Straße. Zusätzlich zur Längsverlegung wurde an 11 Stellen die Asphaltfahrbahn gequert.

Im Anschluss an die Leitungsarbeiten wurde die Fahrbahn ab Kreuzung Paulusstraße bis zur Werner-Bock-Straße dann Ende August einheitlich mit einem lärmoptimierten Asphalt versehen. Der ursprüngliche Auftrag zum Anlegen der Radfahrschleuse wurde dementsprechend erweitert.

Somit ergibt sich für die Anlieger der August-Bebel-Straße für den Gesamtbereich ab Brandenburger Straße bis zur Werner-Bock-Straße heute durch die neue lärmarme Fahrbahndecke eine spürbare Lärminderung.

Die Stadtwerke haben die Kosten für die endgültigen Deckenarbeiten im Bereich ihrer Fahrbahnaufbrüche übernommen.

Die Anlage (s. Rückseite) dient der Verdeutlichung des Sachverhaltes.

# August-Bebel-Straße

R 4685 93 m


Bereich des Hauptauftrages:

Bereich der Erweiterung (NA 4):  
Erweiterung aufgrund  
Leitungsverlegung in der Fahrbahn.  
Stadtwerke übernehmen die  
anteiligen Kosten. Diese Kosten sind  
im Nachtrag nicht enthalten.

Gebaut Sommer 2016

Gebaut Sommer 2017  
im Anschluss an  
Leitungsverlegung

Leitungsverlegung  
Stadtwerke Sommer  
2017 in  
Asphaltfahrbahn:  
schwarze Linien

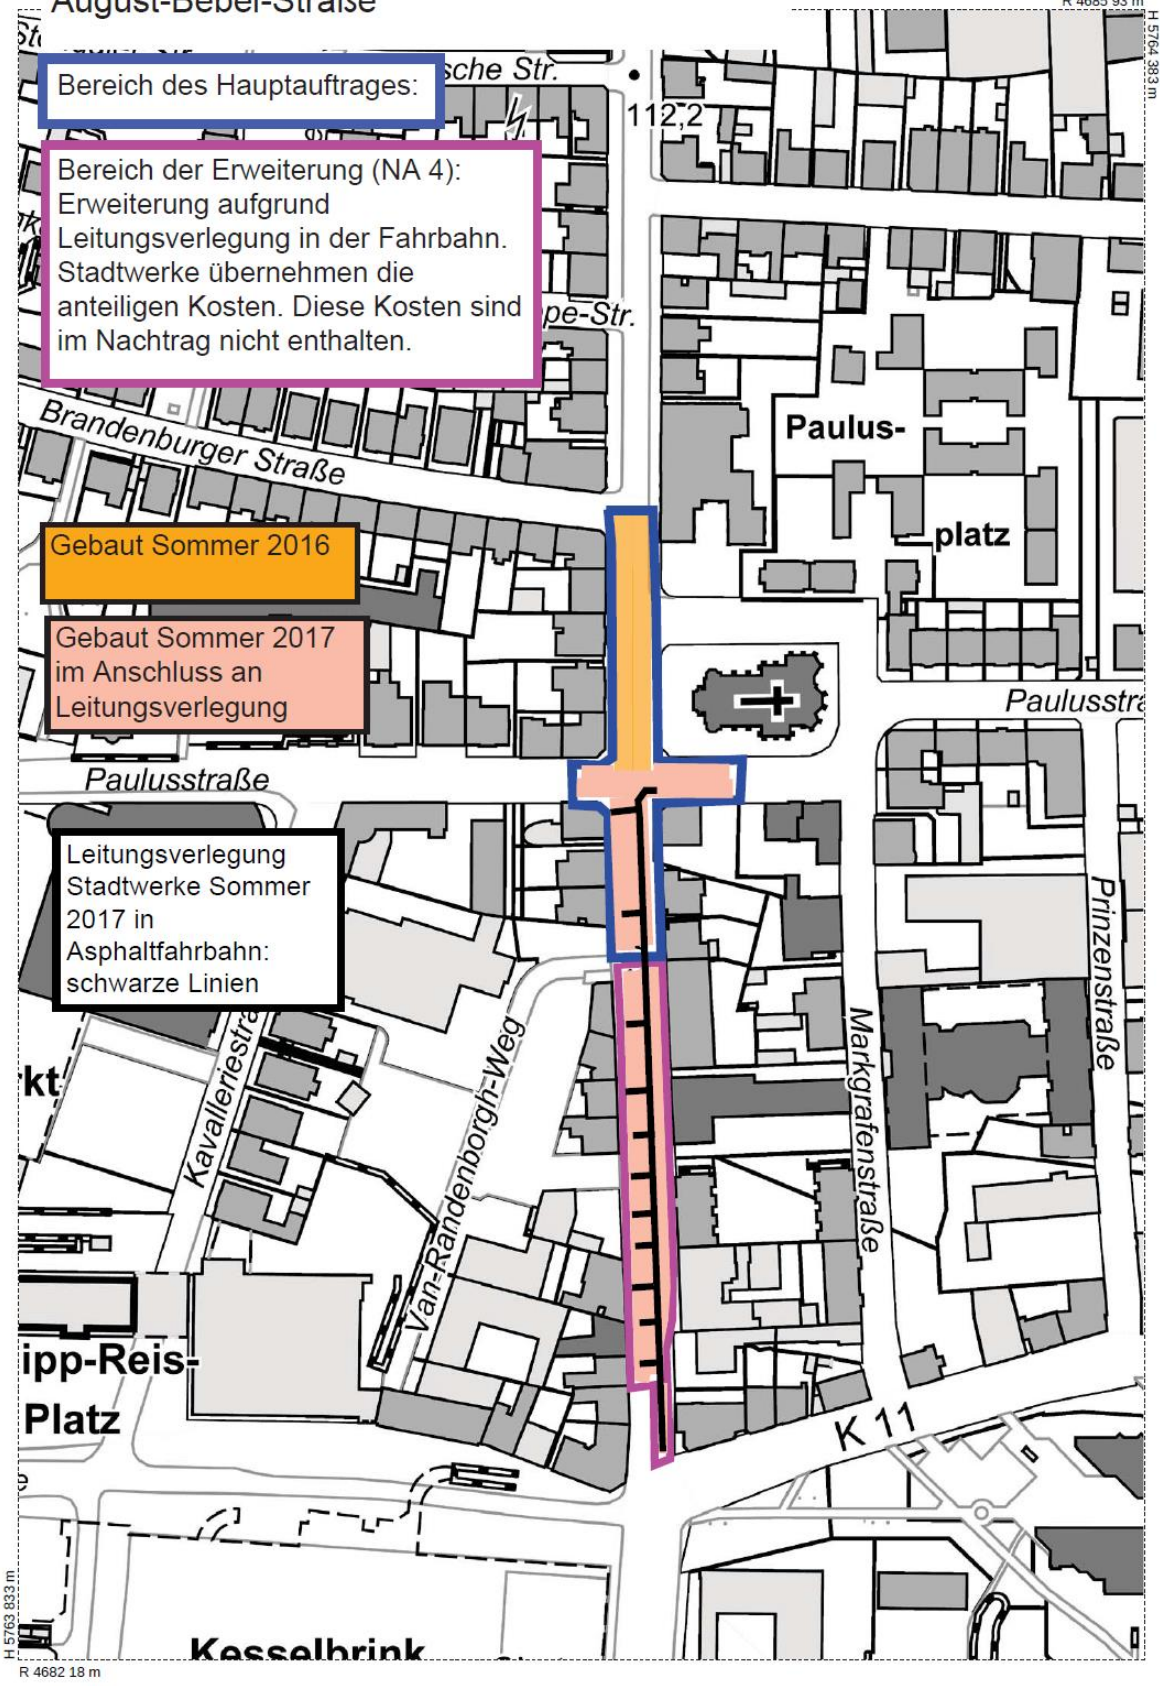

H 5763 833 m

R 4682 18 m
